CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV • PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MỎ

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 9 THÁNG NĂM 2026

Nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2026

Báo cáo Giám đốc Công ty

Trình bày: Nguyễn Văn Thúy – Trưởng phòng KCM

Quảng Ninh, tháng 10/2026

Tổng quan 9 tháng: các chỉ tiêu chính chưa đạt tiến độ 75%

Tiến độ thời gian 9 tháng = 9/12 = 75,0%. Tỷ lệ % = TH 9 tháng ÷ KH năm × 100.

vạch vàng = mốc tiến độ 75%

THAN NGUYÊN KHAI HẦM LÒ

1.814.612,8

tấn

KH QĐ 2675: 2.500.000 tấn — **72,6%**

KH KH 3374: 2.550.000 tấn — **71,2%**

MÉT LÒ ĐÀO CBSX

18.202,4

m

KH QĐ 2675: 26.230 m — **69,4%**

KH KH 3374: 25.730 m — **70,7%**

MÉT LÒ XÉN

5.150,7

m

KH QĐ 2675: 7.500 m — **68,7%**

KH KH 3374: 7.125 m — **72,3%**

Độ tro BQ than NK hầm lò

38,1%

KH 36,5% → cao hơn 1,6 điểm %

Hệ số mét lò CBSX

10,03 m/1000 T

KH: 10,49 (QĐ 2675) / 10,09 (3374)

Tổn thất khai thác hầm lò

19,08%

KH 19,14% → đạt

Bình quân than / tháng


201.623,6 t

Q.IV cần 228.462,4 t/tháng (QĐ 2675)

Nguồn: File KLM chốt 13/10/2026 – sheet TKV (cộng T1–T9, cột G:O); sheet PHU_LUC cột E (QĐ 2675), F (3374), ô V30, V131.

Sản lượng than theo tháng: quý III thấp nhất, giảm 82.975,1 tấn so với quý II

Đơn vị: tấn. Đường ngang: bình quân tháng cần đạt theo KH năm QĐ 2675 = 2.500.000 ÷ 12 = 208.333,3 tấn.

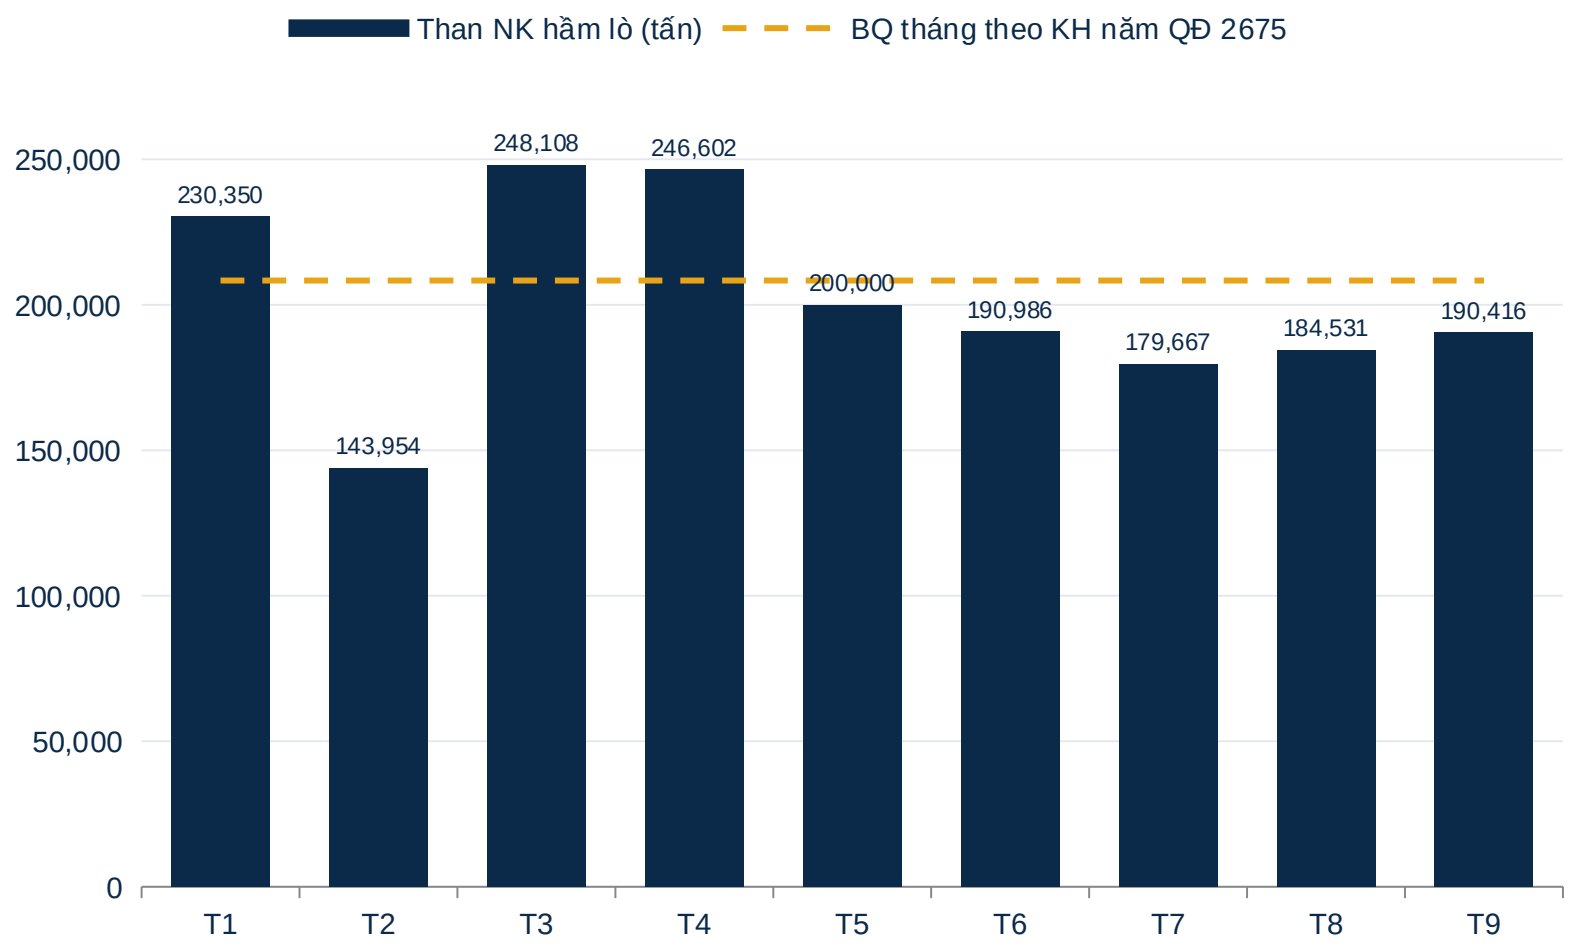

Kỳ	Than NK (tấn)	BQ/tháng
Quý I	622.411,2	207.470,4
Quý II	637.588,3	212.529,4
Quý III	554.613,3	184.871,1
Cộng 9 tháng	**1.814.612,8**	**201.623,6**


Nhận xét

- Cao nhất: tháng 3 – 248.107,8 tấn.
- Thấp nhất: tháng 2 – 143.953,8 tấn.
- Quý III: 554.613,3 tấn, giảm 82.975,1 tấn (−13,0%) so với quý II.
- Tháng 7–9 đều dưới mức bình quân KH năm.

Nguồn: sheet TKV dòng 114 (Than hầm lò), cột G:O.

Mét lò đào, mét lò xén: tháng 9 đạt 2.459,9 m – cao nhất từ đầu năm

Đơn vị: m. Mét lò đào CBSX = lò đá + lò than.

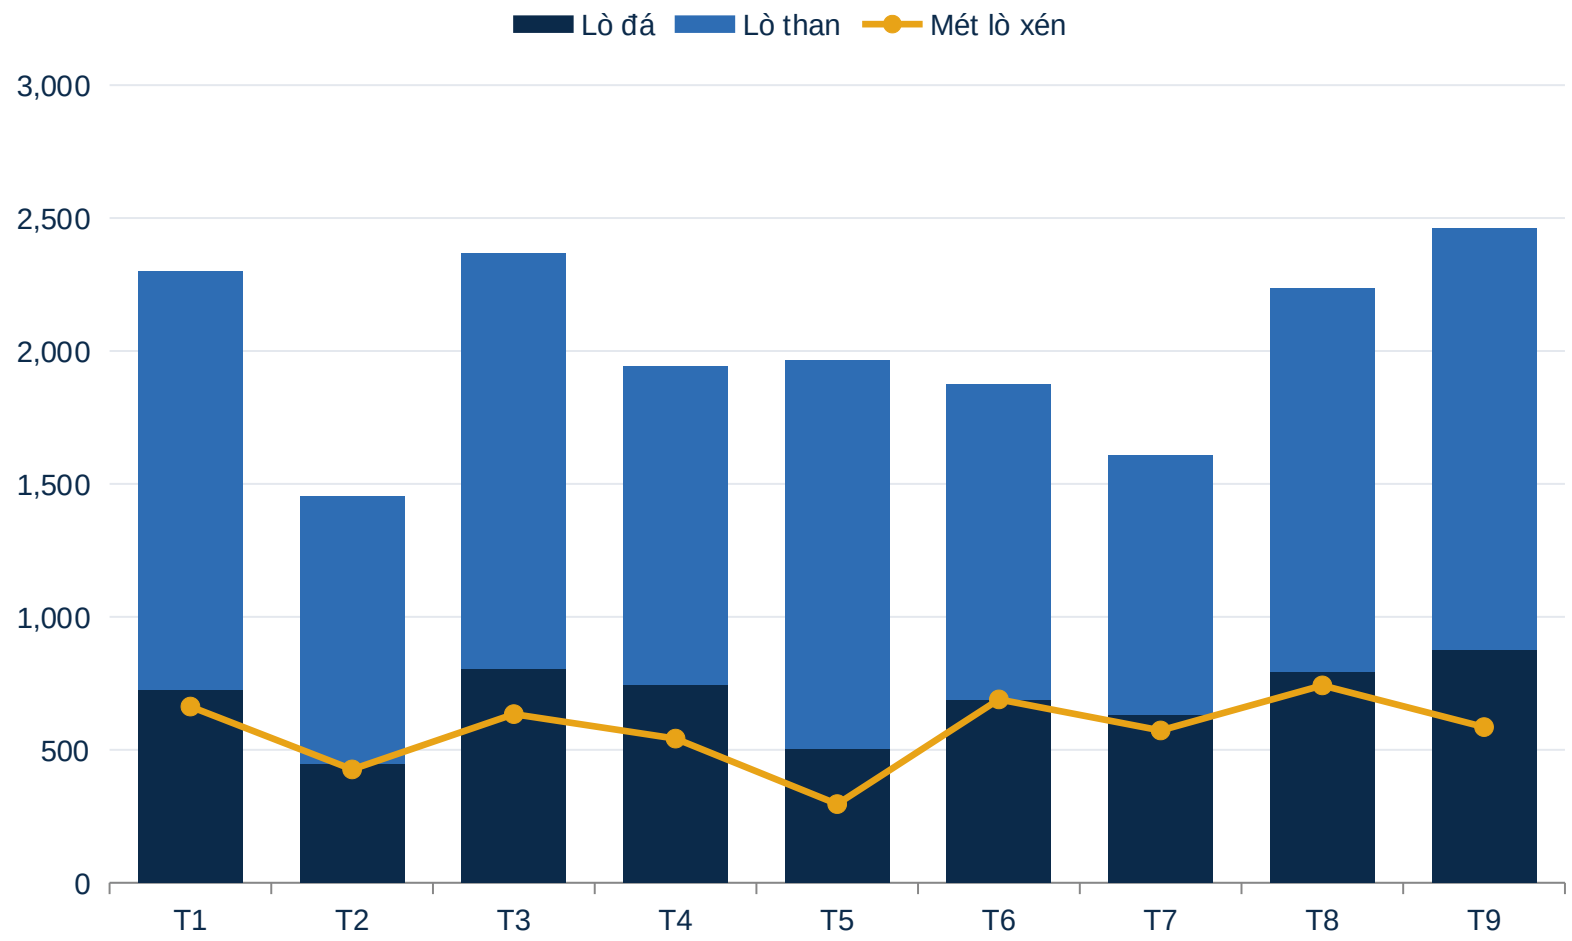

Kỳ	Lò đào (m)	Lò xén (m)
Quý I	6.120,4	1.723,0
Quý II	5.779,7	1.527,4
Quý III	6.302,3	1.900,3
Cộng 9 tháng	**18.202,4**	**5.150,7**


Nhận xét

- Lò đào quý III đạt 6.302,3 m – cao nhất 3 quý.
- Lò đá 9 tháng: 6.209,65 m, đạt 73,0% KH (QĐ 2675); lò than 11.992,75 m, đạt 67,7%.
- Xén trong đá đạt 84,1%; xén trong than chỉ đạt 50,5% KH.

Nguồn: sheet TKV dòng 85 (mét lò đào), 96 (lò đá), 104 (mét lò xén), cột G:O; KH: sheet PHU_LUC cột E.

Sản lượng theo công nghệ: CGH hạng nhẹ và lò chợ giàn mềm đạt thấp

Tỷ lệ % hoàn thành so với KH năm theo QĐ 2675 (KH 3374 không có số chi tiết theo công nghệ).

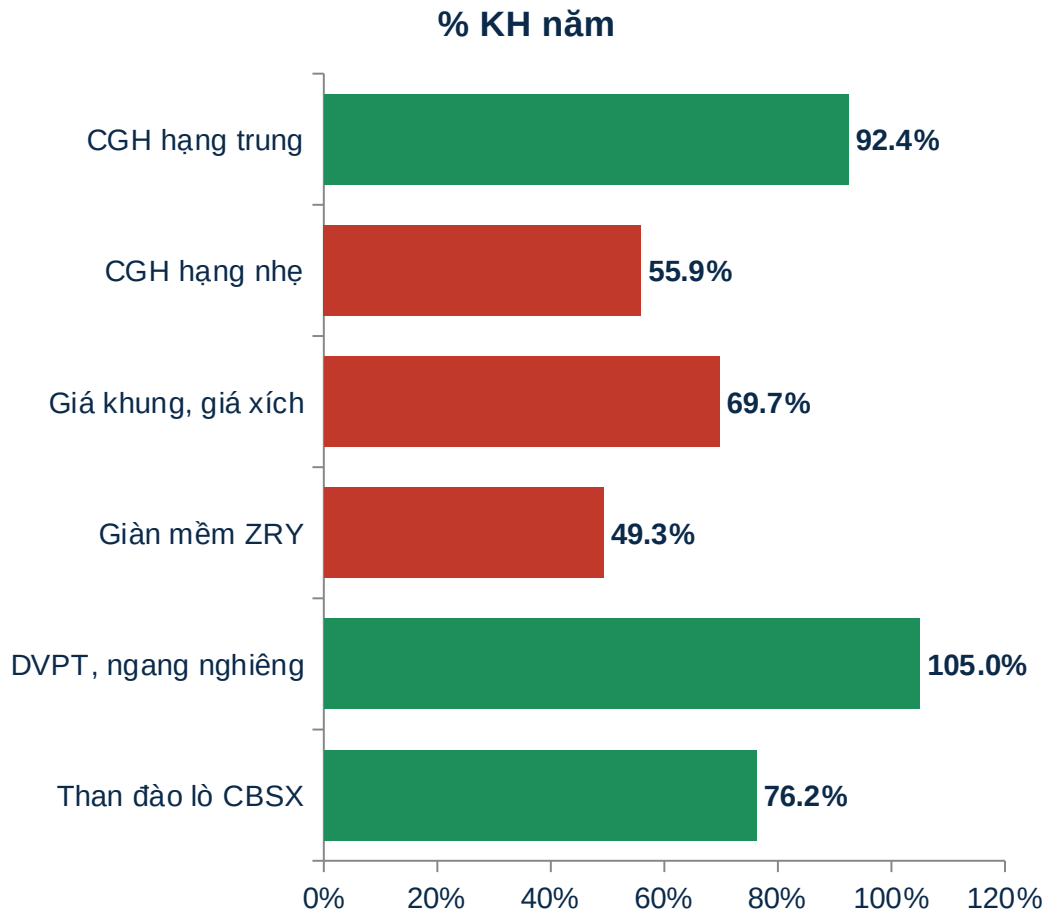

Công nghệ	KH năm (t)	TH 9T (t)	% KH	Tỷ trọng %
Lò chợ CGH (máy khấu)	732.000	564.815,0	77,2	31,1
+ CGH hạng trung	426.000	393.720,9	92,4	21,7
+ CGH hạng nhẹ	306.000	171.094,1	55,9	9,4
Giá khung, giá xích	1.269.200	884.485,8	69,7	48,7
Giàn mềm (ZRY)	167.000	82.283,4	49,3	4,5
DVPT, ngang nghiêng	15.000	15.756,3	105,0	0,9
Than đào lò CBSX	302.680	230.692,3	76,2	12,7
Than xén, hạ nền	14.120	36.580,0	259,1	2,0
Tổng cộng	**2.500.000**	**1.814.612,8**	72,6	**100,0**

- CGH hạng nhẹ không có sản lượng tháng 7, 8, 9.
- Giá khung, giá xích chiếm 48,7% sản lượng nhưng mới đạt 69,7% KH – yếu tố quyết định hoàn thành KH năm.

Nguồn: sheet TKV dòng 116–124; sheet PHU_LUC dòng 20–28 (cột E: KH QĐ 2675).

Đào lò theo vật liệu chống, công nghệ và khối lượng gia cố đường lò

So với KH năm (QĐ 2675) và PA gia cố đường lò số 5342/TKCM-KCM.

Mét lò đào CBSX theo vật liệu chống, công nghệ

Chỉ tiêu	KH năm (m)	TH 9T (m)	% KH
Lò chống sắt	24.310	16.782,0	**69,0**
Lò chống neo	1.000	861,6	**86,2**
Lò chống gỗ	920	558,8	**60,7**
Đào bán CGH (xe khoan + máy xúc)	1.180	1.027,0	**87,0**
Đào CGH đồng bộ (combai EBH-45)	1.200	459,9	**38,3**

- Combai EBH-45: không có khối lượng từ tháng 6.
- Lò chống neo: quý III chỉ đạt 5,6 m.
- Tự làm 15.691,1 m (86,2%); thuê ngoài 2.511,3 m (13,8%).

Khối lượng gia cố, sửa chữa đường lò


Chỉ tiêu	KH năm (m)	TH 9T (m)	% KH
Khoan neo cáp gia cố	750	1.621,0	**216,1**
Khoan ép vữa xi măng	700	327,5	**46,8**
Chống đội, đánh khuôn	1.000	1.114,0	**111,4**
Chống dặm	–	47,4	–
Khoan ép hóa chất	300	10,0	**3,3**
Đổ bê tông	1.100	0,0	**0,0**

- Ép vữa xi măng, ép hóa chất, đổ bê tông chậm so với PA gia cố.
- Neo cáp, chống đội đã vượt KH năm.

Nguồn: sheet TKV dòng 98, 102, 130–138, 141, ô AF156, AG156; sheet PHU_LUC cột E dòng 64–69, 110–115. Lò chống sắt = tổng − chống neo − chống gỗ.

Sản lượng than theo phân xưởng khai thác (lũy kế 9 tháng)

11 PX khai thác: 1.656.144,6 tấn = 91,3% sản lượng Công ty. Chưa có KH giao theo PX nên chưa đánh giá % hoàn thành từng đơn vị.

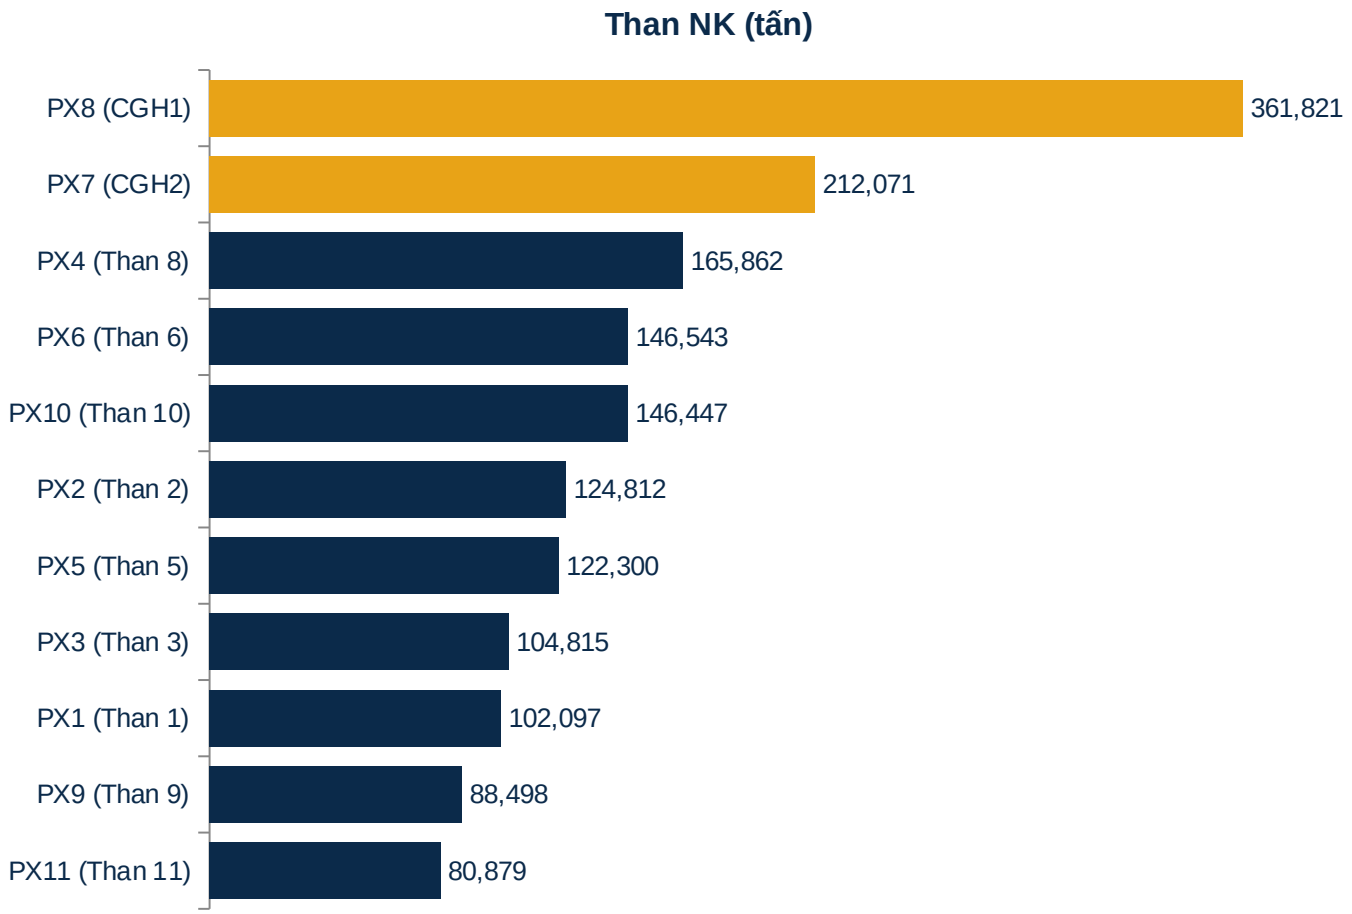

Các phân xưởng đào lò

Đơn vị	Lò đào (m)	Lò xén (m)	Than (t)
PX12 (CGĐB)	1.191,5	559,8	26.296,4
PX13 (BCG)	977,1	114,0	1.408,6
PX14 (ĐL3)	1.315,6	508,7	28.208,4
PX15 (ĐL1)	1.446,4	451,0	25.229,1
PX16 (ĐL5)	1.926,2	416,0	35.782,3
PX17 (ĐL6)	1.434,7	533,1	24.407,6
Cộng 6 PX đào lò	**8.291,5**	**2.582,6**	**141.332,4**
Đơn vị khác*	2.511,3	771,0	17.135,8

• 2 PX CGH (PX7, PX8) chiếm 31,6% sản lượng Công ty.

* Đơn vị khác: HL1, PTH, QN, VN (thuê ngoài), KSKM, VT1, VT2.

Nguồn: sheet TKV, bảng tổng hợp theo phân xưởng dòng 153–199 (lũy kế 9 tháng, đã đối chiếu khớp tổng Công ty).

Tồn tại và nguyên nhân

1	**Sản lượng, mét lò đào, mét lò xén**	Đạt 72,6% / 69,4% / 68,7% KH (QĐ 2675) – dưới tiến độ 75%
2	**Lò chợ CGH hạng nhẹ**	Không có sản lượng quý III; 9 tháng đạt 55,9% KH
3	**Lò chợ giàn mềm (ZRY)**	Đạt 49,3% KH; quý III 16.829,6 t, giảm so với quý I (39.665,9 t)
4	**Đào lò combai EBH-45, chống neo**	EBH-45 đạt 38,3%, dừng từ tháng 6; chống neo quý III 5,6 m
5	**Mét lò xén trong than**	Đạt 50,5% KH (xén trong đá 84,1%)
6	**Chất lượng than**	Độ tro 38,1%, vượt KH 1,6 điểm %
7	**Gia cố đường lò**	Ép vữa 46,8%, ép hóa chất 3,3%, đổ bê tông chưa thực hiện

NGUYÊN NHÂN

[Phòng KCM bổ sung nguyên nhân cụ thể cho từng tồn tại: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện khai thác, chuyển diện, thiết bị, lao động…]

File số liệu KLM không có thông tin nguyên nhân nên chưa điền.

Nguồn: tổng hợp từ các slide 2–6.

Quý IV/2026: phải tăng 13,3% sản lượng bình quân tháng để hoàn thành KH năm

Còn lại = KH năm − TH 9 tháng; BQ tháng quý IV = Còn lại ÷ 3; BQ tháng đã đạt = TH 9 tháng ÷ 9.

Chỉ tiêu	Còn lại (QĐ 2675)	BQ/tháng Q.IV	Còn lại (3374)	BQ/tháng Q.IV	BQ đã đạt 9T
Than NK hầm lò (tấn)	685.387,2	228.462,4	735.387,2	245.129,1	201.623,6
Mét lò đào CBSX (m)	8.027,6	2.675,9	7.527,6	2.509,2	2.022,5
Mét lò xén (m)	2.349,3	783,1	1.974,3	658,1	572,3

GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

- Tập trung điều hành lò chợ CGH, giá khung, giá xích (79,9% sản lượng Công ty); giảm thời gian dừng thiết bị.
- Đẩy nhanh chuẩn bị, lắp đặt diện thay thế, không gián đoạn khi chuyển diện; xem xét khôi phục lò chợ CGH hạng nhẹ.
- Duy trì tốc độ đào lò tháng 9 (2.459,9 m); ưu tiên lò chuẩn bị diện 2027; đưa EBH-45 trở lại khi đủ điều kiện.
- Khai thác chọn lọc, hạn chế lẫn đất đá vách, trụ để đưa độ tro về mức KH 36,5%.
- Thực hiện các hạng mục gia cố còn chậm (ép vữa, ép hóa chất, đổ bê tông) theo PA 5342/TKCM-KCM.
- Giao KH quý IV chi tiết đến từng phân xưởng; theo dõi, đánh giá hàng tuần.

Nguồn: tính từ TH 9 tháng (sheet TKV) và KH năm (sheet PHU_LUC cột E, F). 79,9% = (564.815,0 + 884.485,8) ÷ 1.814.612,8 × 100.
