CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV • PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MỎ

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 9 THÁNG NĂM 2026

Đánh giá, nguyên nhân – Nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2026

Báo cáo Giám đốc Công ty

Trình bày: Nguyễn Văn Thúy – Trưởng phòng KCM

Quảng Ninh, tháng 10/2026

KẾT QUẢ 9 THÁNG (TH / KH QĐ 2675)

Than nguyên khai hầm lò

1.814.612,8 tấn

72,6% kế hoạch năm

Mét lò đào CBSX

18.202,4 m

69,4% kế hoạch năm

Mét lò xén

5.150,7 m

68,7% kế hoạch năm

Nội dung báo cáo

I

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Sản lượng than, mét lò đào, mét lò xén; lũy kế so với tiến độ; chỉ tiêu công nghệ

II

Kết quả theo công nghệ khai thác, đào lò

Cơ cấu sản lượng, lò chợ CGH, giá khung, giàn mềm; vật liệu chống, cơ giới hóa đào lò, gia cố, tiêu hao vật tư

III

Kết quả theo phân xưởng

11 phân xưởng khai thác, 6 phân xưởng đào lò, đơn vị thuê ngoài

IV

Tồn tại, nguyên nhân – Nhiệm vụ, giải pháp quý IV

Khối lượng còn lại phải thực hiện, giải pháp, kiến nghị

Căn cứ, nguồn số liệu và quy ước tính toán

Căn cứ

- Quyết định số 2675/QĐ-TKV của Tập đoàn TKV (kế hoạch năm 2026).
- Kế hoạch số 3374/KH-TKV của Tập đoàn TKV (kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2026).
- Phương án kỹ thuật gia cố đường lò năm 2026 số 5342/TKCM-KCM.
- Bảng tổng hợp khối lượng mỏ (KLM) thực hiện tháng 01 – 9/2026, chốt ngày 13/10/2026.

Quy ước tính toán

- Tiến độ thời gian 9 tháng = 9/12 = 75,0%.
- Tỷ lệ hoàn thành (%) = TH 9 tháng ÷ KH năm × 100.
- Lũy kế KH theo tháng: phân bổ đều KH năm cho 12 tháng (file không có KH tháng).
- Hệ số mét lò = mét lò đào CBSX ÷ sản lượng than × 1.000.
- Số liệu thực hiện: cộng tháng 1–9 (sheet TKV, PHU_LUC cột G:Q).
- Làm tròn 1 chữ số thập phân; màu đỏ: dưới 75% hoặc không đạt, màu xanh: từ 75% trở lên.

Nguồn: 3_TONG_HOP_KLM/B1.BC_TKV_T9-2026_13-10-2026_9-thang-CHOT.xlsx

I

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- Tổng quan và bảng chỉ tiêu chủ yếu
- Sản lượng than, mét lò đào, mét lò xén theo tháng, quý, lũy kế
- Các chỉ tiêu công nghệ

Tổng quan 9 tháng: các chỉ tiêu chính chưa đạt tiến độ 75%

Tiến độ thời gian 9 tháng = 75,0%. Tỷ lệ % = TH 9 tháng ÷ KH năm × 100. Vạch vàng trên thanh tiến độ = mốc 75%.

THAN NGUYÊN KHAI HẦM LÒ

1.814.612,8 tấn

QĐ 2675: 2.500.000 tấn — **72,6%**

KH 3374: 2.550.000 tấn — **71,2%**

MÉT LÒ ĐÀO CBSX

18.202,4 m

QĐ 2675: 26.230 m — **69,4%**

KH 3374: 25.730 m — **70,7%**

MÉT LÒ XÉN

5.150,7 m

QĐ 2675: 7.500 m — **68,7%**

KH 3374: 7.125 m — **72,3%**

Độ tro BQ than NK hầm lò

38,1%

KH 36,5% → cao hơn 1,6 điểm %

Hệ số mét lò CBSX

10,03 m/1000 T

KH 10,49 (QĐ 2675) / 10,09 (3374)

Tổn thất khai thác hầm lò

19,08%

KH 19,14% → đạt

Bình quân than / tháng

201.623,6 t

Quý IV cần 228.462,4 t/tháng (QĐ 2675)

Nguồn: sheet TKV dòng 85, 104, 114 (cộng T1–T9); sheet PHU_LUC cột E (QĐ 2675), F (3374), ô V30, V119, V131.

Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2026


TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm (QĐ 2675)	KH năm (3374)	TH 9 tháng	% KH QĐ 2675	% KH 3374
1	**Than nguyên khai hầm lò**	tấn	2.500.000	2.550.000	**1.814.612,8**	**72,6**	**71,2**
2	**Mét lò đào CBSX**	m	26.230	25.730	**18.202,4**	**69,4**	**70,7**
	– Lò đá	m	8.510	8.460	6.209,65	73,0	73,4
	– Lò than	m	17.720	17.270	11.992,75	67,7	69,4
3	**Mét lò xén**	m	7.500	7.125	**5.150,7**	**68,7**	**72,3**
	– Xén trong đá	m	4.062	3.860	3.415,35	84,1	88,5
	– Xén trong than	m	3.438	3.265	1.735,35	50,5	53,2
4	**Hệ số mét lò CBSX**	m/1000 T	10,49	10,09	**10,03**	95,6	99,4
5	**Độ tro BQ than NK hầm lò**	%	36,5		**38,1**	**104,4**	
6	**Tổn thất khai thác hầm lò**	%	19,14		**19,08**	**99,7**	

Lưu ý: tô màu tỷ lệ chỉ áp dụng cho chỉ tiêu khối lượng (dòng 1–3, so với mốc 75%). Độ tro 104,4% nghĩa là vượt KH (không đạt); tổn thất 99,7% là đạt.

Nguồn: sheet TKV dòng 85, 96, 100, 104, 105, 109, 114; sheet PHU_LUC cột E, F, dòng 15–97, 119, 131; ô V30.

Sản lượng than theo tháng: quý III thấp nhất, giảm 82.975,1 tấn so với quý II

Đơn vị: tấn. Đường nét đứt: bình quân tháng theo KH năm QĐ 2675 = 2.500.000 ÷ 12 = 208.333,3 tấn.

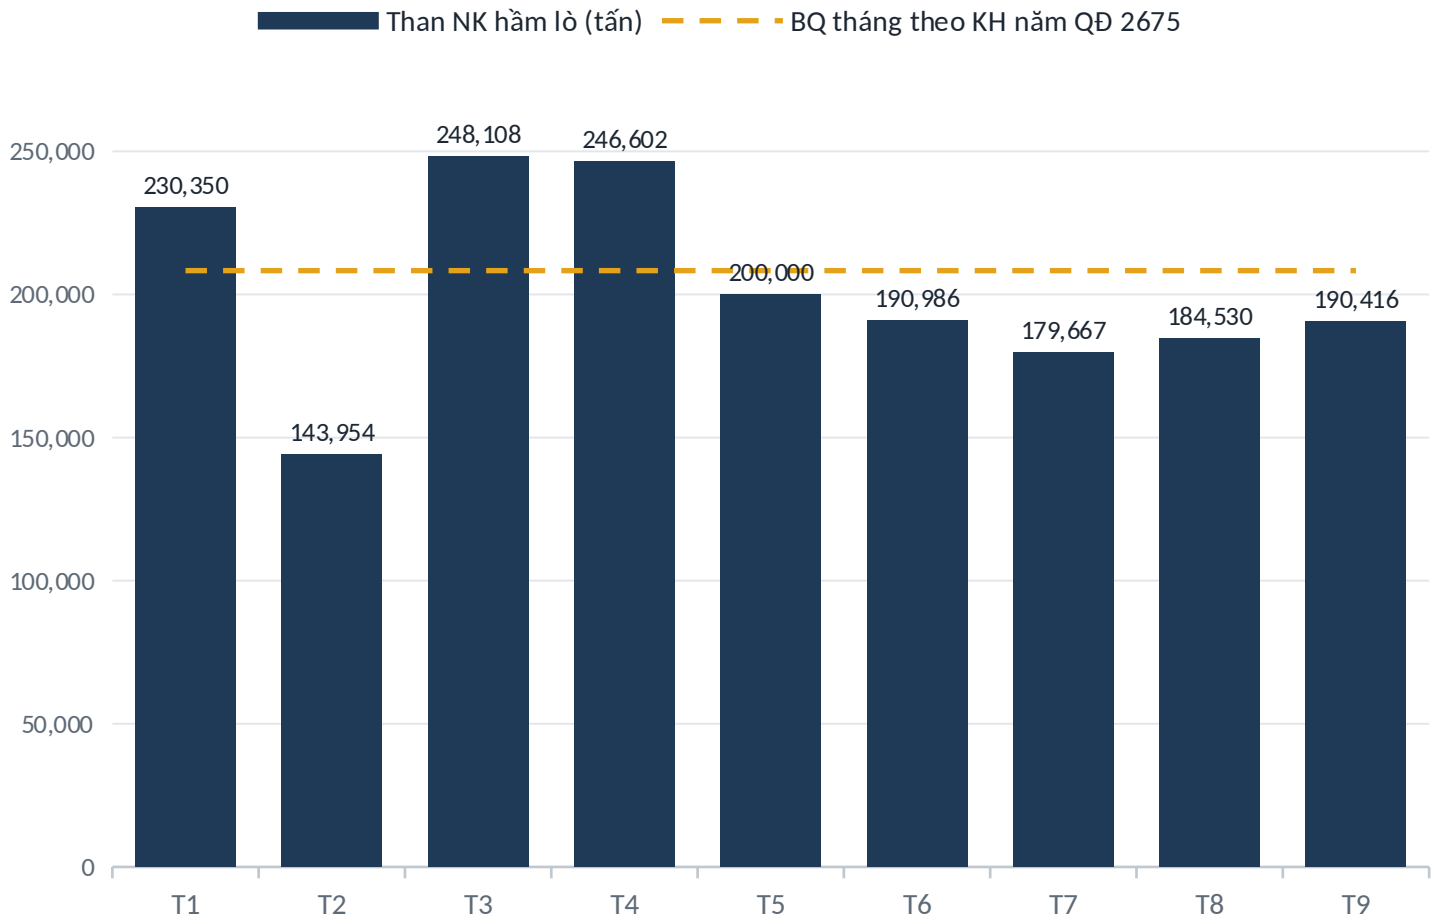

Kỳ	Than NK (tấn)	BQ/tháng
Quý I	622.411,2	207.470,4
Quý II	637.588,3	212.529,4
Quý III	**554.613,3**	**184.871,1**
Cộng 9 tháng	**1.814.612,8**	**201.623,6**


NHẬN XÉT

- Cao nhất: tháng 3 – 248.107,8 tấn; thấp nhất: tháng 2 – 143.953,8 tấn.
- Quý III giảm 82.975,1 tấn (-13,0%) so với quý II.
- Từ tháng 5 đến tháng 9, sản lượng các tháng đều thấp hơn mức bình quân KH năm.

Nguồn: sheet TKV dòng 114 (Than hầm lò), cột G:O.

Lũy kế sản lượng than: đến hết tháng 9 thấp hơn tiến độ KH 60.387,2 tấn

Đơn vị: tấn. KH lũy kế = 2.500.000 ÷ 12 × số tháng (phân bổ đều, theo QĐ 2675).

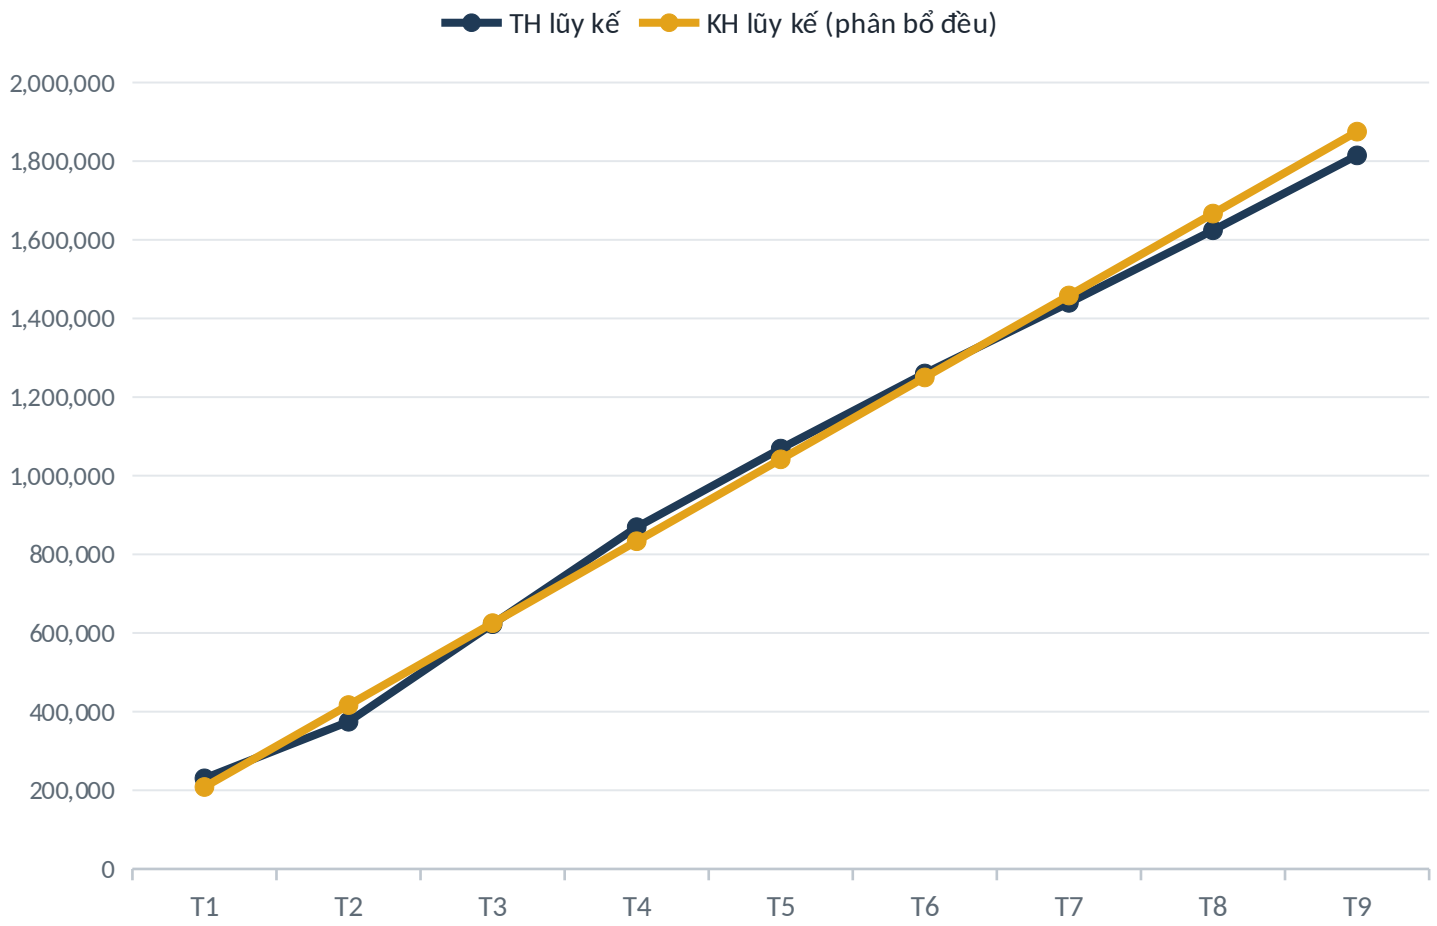

Tháng	TH lũy kế	KH lũy kế	Chênh lệch
T3	622.411,2	625.000,0	-2.588,8
T6	1.259.999,5	1.250.000,0	9.999,5
T9	1.814.612,8	1.875.000,0	-60.387,2


NHẬN XÉT

- Hết quý I: thấp hơn tiến độ 2.588,8 tấn.
- Hết quý II: vượt tiến độ 9.999,5 tấn.
- Hết tháng 9: thấp hơn tiến độ 60.387,2 tấn (QĐ 2675); so với KH 3374: thấp hơn tiến độ 97.887,2 tấn.

Nguồn: sheet TKV dòng 114 (cộng dồn T1–T9); KH: sheet PHU_LUC ô E15, F15.

Mét lò đào CBSX theo tháng: tháng 9 đạt 2.459,9 m – cao nhất từ đầu năm

Đơn vị: m. Mét lò đào CBSX = lò đá + lò than. Đường nét đứt: BQ tháng theo KH QĐ 2675 = 26.230 ÷ 12 = 2.185,8 m.

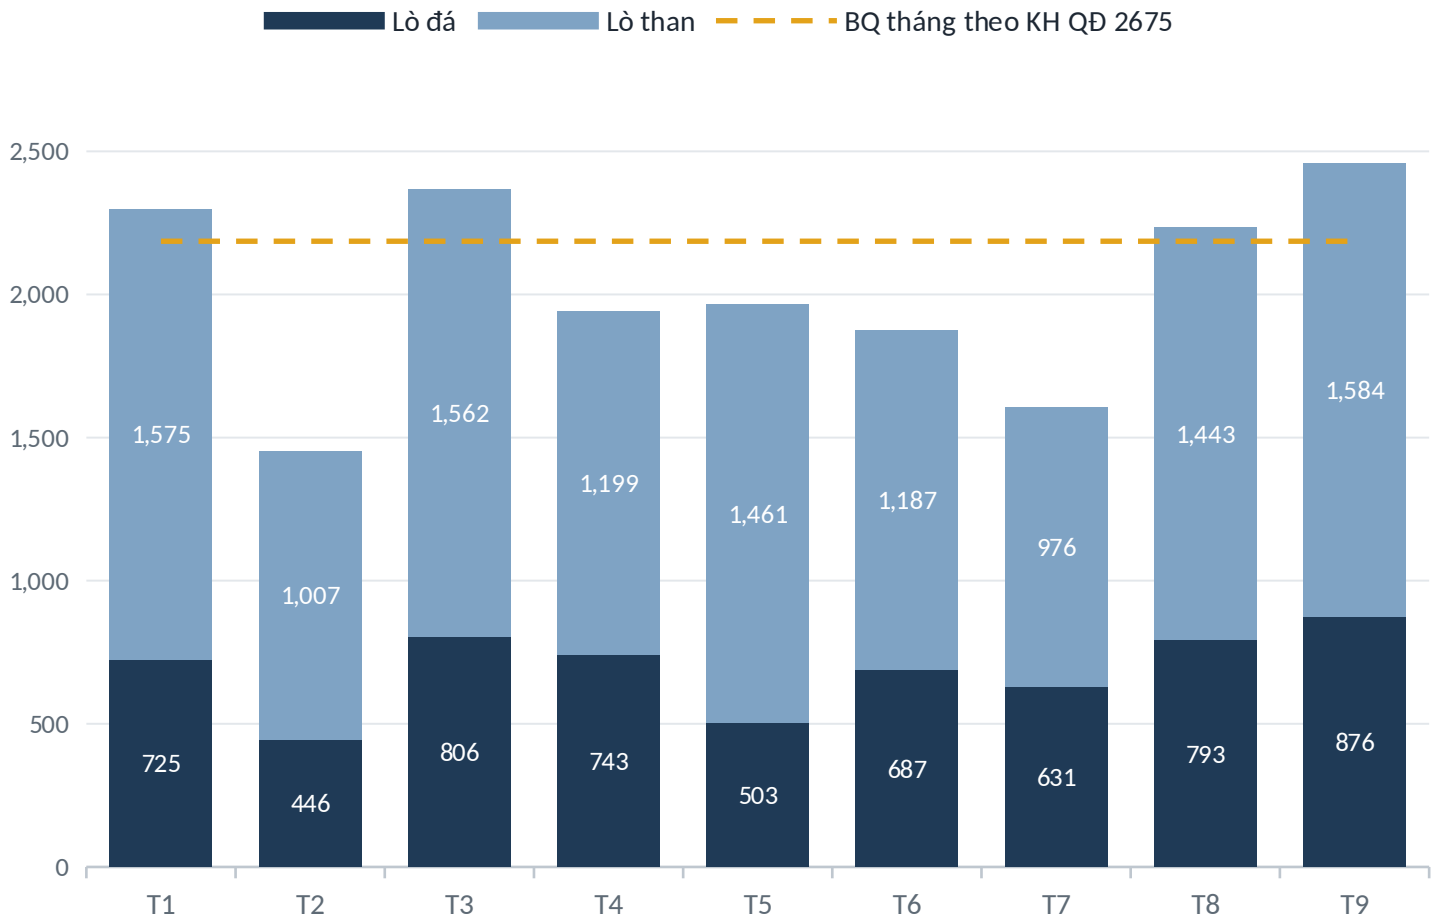

Kỳ	Lò đào (m)	Lò đá (m)	Lò than (m)
Quý I	6.120,4	1.976,80	4.143,60
Quý II	5.779,7	1.933,20	3.846,50
Quý III	**6.302,3**	2.299,65	4.002,65
Cộng 9T	**18.202,4**	**6.209,65**	**11.992,75**


NHẬN XÉT

- Quý III đạt 6.302,3 m – cao nhất 3 quý.
- Lò đá đạt 73,0% KH; lò than đạt 67,7% KH (QĐ 2675).
- Chỉ tháng 1, 3, 8, 9 đạt trên mức bình quân KH năm.

Nguồn: sheet TKV dòng 85 (mét lò đào), 96 (qua đá), 100 (qua than), cột G:O.

Lũy kế mét lò đào: hết tháng 9 thấp hơn tiến độ KH 1.470,1 m

Đơn vị: m. KH lũy kế = 26.230 ÷ 12 × số tháng (phân bổ đều, theo QĐ 2675).

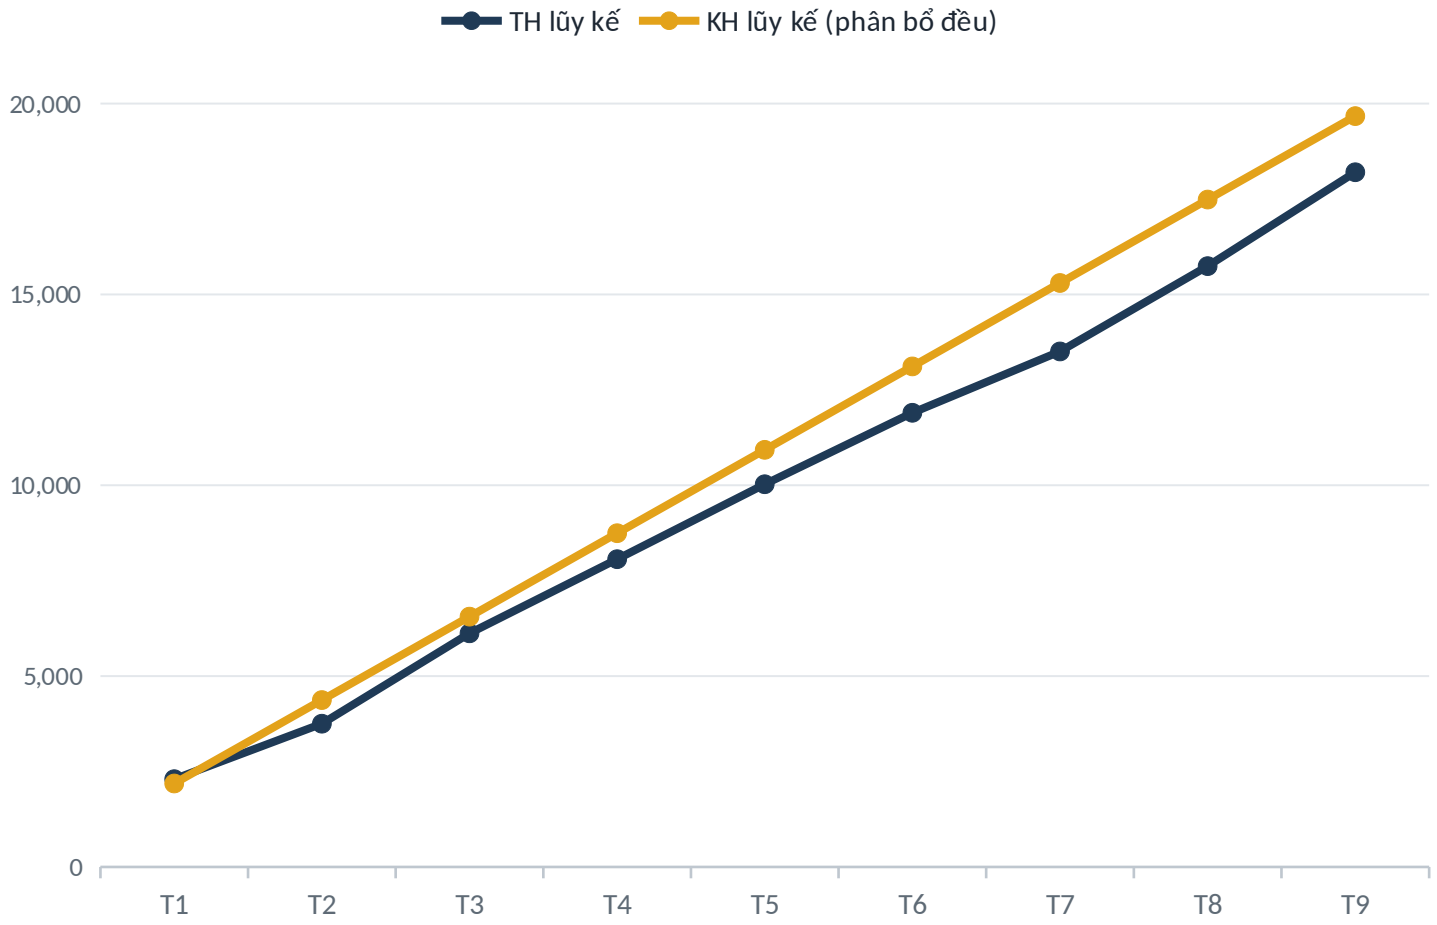

Tháng	TH lũy kế	KH lũy kế	Chênh lệch
T3	6.120,4	6.557,5	-437,1
T6	11.900,1	13.115,0	-1.214,9
T9	18.202,4	19.672,5	-1.470,1


NHẬN XÉT

- Hết quý I: thấp hơn tiến độ 437,1 m.
- Hết quý II: thấp hơn tiến độ 1.214,9 m.
- Hết tháng 9: thấp hơn tiến độ 1.470,1 m (QĐ 2675); so với KH 3374: thấp hơn tiến độ 1.095,1 m.

Nguồn: sheet TKV dòng 85 (cộng dồn T1–T9); KH: sheet PHU_LUC ô E39, F39.

Mét lò xén: đạt 68,7% KH; xén trong than chỉ đạt 50,5%

Đơn vị: m. Mét lò xén = xén trong đá + xén trong than.

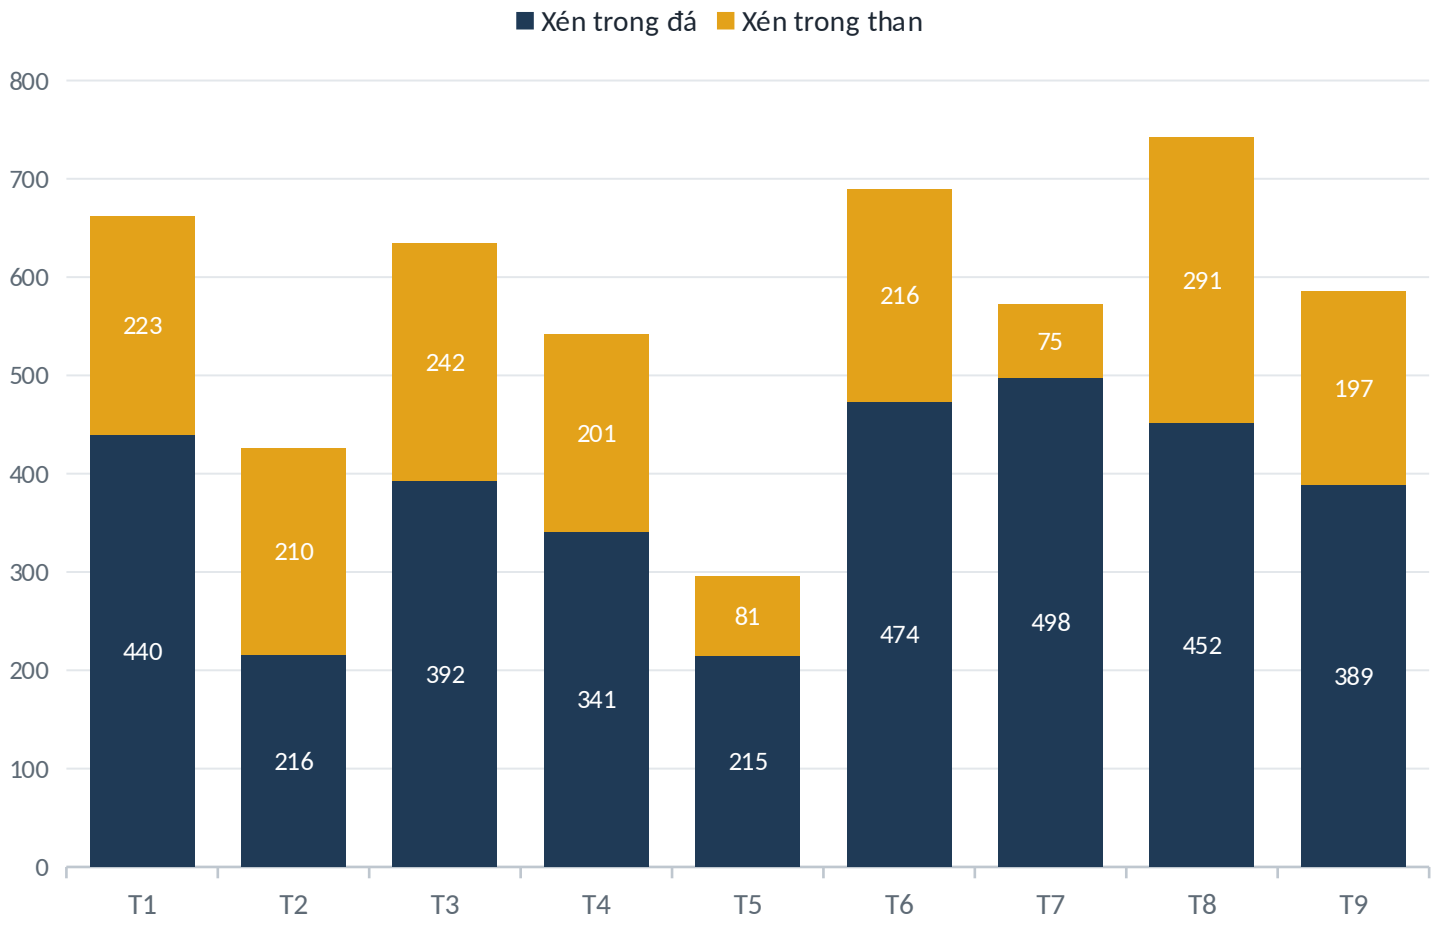

Chỉ tiêu	KH 2675	KH 3374	TH 9T	% 2675	% 3374
Mét lò xén	7.500	7.125	**5.150,7**	**68,7**	**72,3**
– Trong đá	4.062	3.860	3.415,35	**84,1**	**88,5**
– Trong than	3.438	3.265	1.735,35	**50,5**	**53,2**

Kỳ	Quý I	Quý II	Quý III	BQ/tháng
Lò xén (m)	1.723,0	1.527,4	**1.900,3**	572,3

NHẬN XÉT

- Tháng 8 cao nhất (742,2 m); tháng 5 thấp nhất (295,8 m).
- Quý III đạt 1.900,3 m – cao nhất 3 quý.
- Xén trong đá vượt tiến độ (84,1%); xén trong than chậm, cần ưu tiên quý IV.

Nguồn: sheet TKV dòng 104, 105, 109, cột G:O; KH: sheet PHU_LUC dòng 92, 96, 97, cột E, F.

Các chỉ tiêu công nghệ chủ yếu 9 tháng năm 2026

So với KH theo QĐ 2675.

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm	TH 9 tháng	Tỷ lệ %
Hệ số mét lò CBSX	m/1000 T	10,49	**10,03**	95,6
Tỷ lệ lò đá / tổng lò CBSX	%	32,44	**34,11**	105,1
Tỷ lệ lò chống sắt / tổng lò CBSX	%	92,68	**92,20**	99,5
Tỷ lệ lò chống neo / tổng lò CBSX	%	3,81	**4,73**	124,2
Tỷ lệ lò chống gỗ / tổng lò CBSX	%	3,51	**3,07**	87,5
Mét lò xén / 1000 tấn than	m/1000 T	3,00	**2,84**	94,6
Tiết diện bình quân lò đá	m^2	16,97	**16,90**	99,6
Tiết diện bình quân lò than	m^2	12,45	**12,50**	100,4
Tổn thất khai thác hầm lò	%	19,14	**19,08**	99,7
Thể trọng than NK hầm lò	tấn/m^3	1,62	**1,63**	100,2

NHẬN XÉT

- Hệ số mét lò 10,03 m/1000 T, thấp hơn KH (10,49) do mét lò đào chậm hơn sản lượng (69,4% so với 72,6%).
- Tỷ lệ lò đá 34,11%, cao hơn KH 32,44%.
- Tỷ lệ lò chống neo 4,73%, cao hơn KH 3,81% nhưng chủ yếu thực hiện trong 6 tháng đầu năm.
- Tổn thất khai thác 19,08%, đạt KH (≤ 19,14%).
- Tiết diện lò đá, lò than bám sát KH.

Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 58, 62, 119–125, 131, 134 (cột E: KH, V: TH, W: tỷ lệ). Đã kiểm tra lại: 18.202,4 ÷ 1.814,6 = 10,03; 6.209,65 ÷ 18.202,4 = 34,11%.

II


PHẦN II

KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ KHAI THÁC, ĐÀO LÒ

- Cơ cấu sản lượng theo công nghệ
- Lò chợ cơ giới hóa, giá khung – giá xích, giàn mềm, DVPT
- Đào lò theo vật liệu chống, cơ giới hóa; tự làm – thuê ngoài
- Gia cố đường lò; tiêu hao vật tư chủ yếu

Cơ cấu sản lượng than 9 tháng theo công nghệ

Tỷ trọng % = sản lượng công nghệ ÷ tổng sản lượng × 100; % KH so với QĐ 2675.

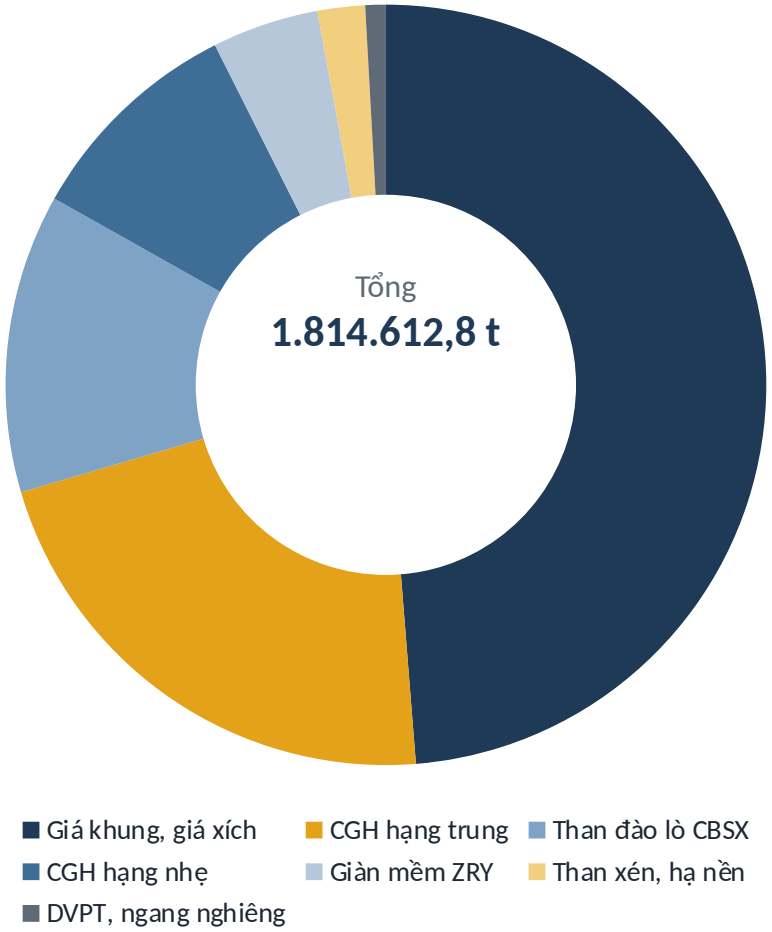

Công nghệ	KH năm (t)	TH 9T (t)	% KH	Tỷ trọng %
Giá khung, giá xích	1.269.200	884.485,8	69,7	48,7
CGH hạng trung	426.000	393.720,9	92,4	21,7
Than đào lò CBSX	302.680	230.692,3	76,2	12,7
CGH hạng nhẹ	306.000	171.094,1	55,9	9,4
Giàn mềm ZRY	167.000	82.283,4	49,3	4,5
Than xén, hạ nền	14.120	36.580,0	259,1	2,0
DVPT, ngang nghiêng	15.000	15.756,3	105,0	0,9
Tổng cộng	**2.500.000**	**1.814.612,8**	**72,6**	**100,0**


NHẬN XÉT

- Than lò chợ chiếm 85,3% sản lượng; riêng giá khung, giá xích 48,7%.
- Than xén, hạ nền vượt 2,6 lần KH năm do mét lò xén qua than, hạ nền phát sinh nhiều.

Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 21–28 (cột G:Q, E); sheet TKV dòng 116–119.

Lò chợ cơ giới hóa: đạt 77,2% KH; CGH hạng nhẹ dừng từ tháng 7

Đơn vị: tấn. KH năm: CGH hạng trung 426.000 t; CGH hạng nhẹ 306.000 t (QĐ 2675).

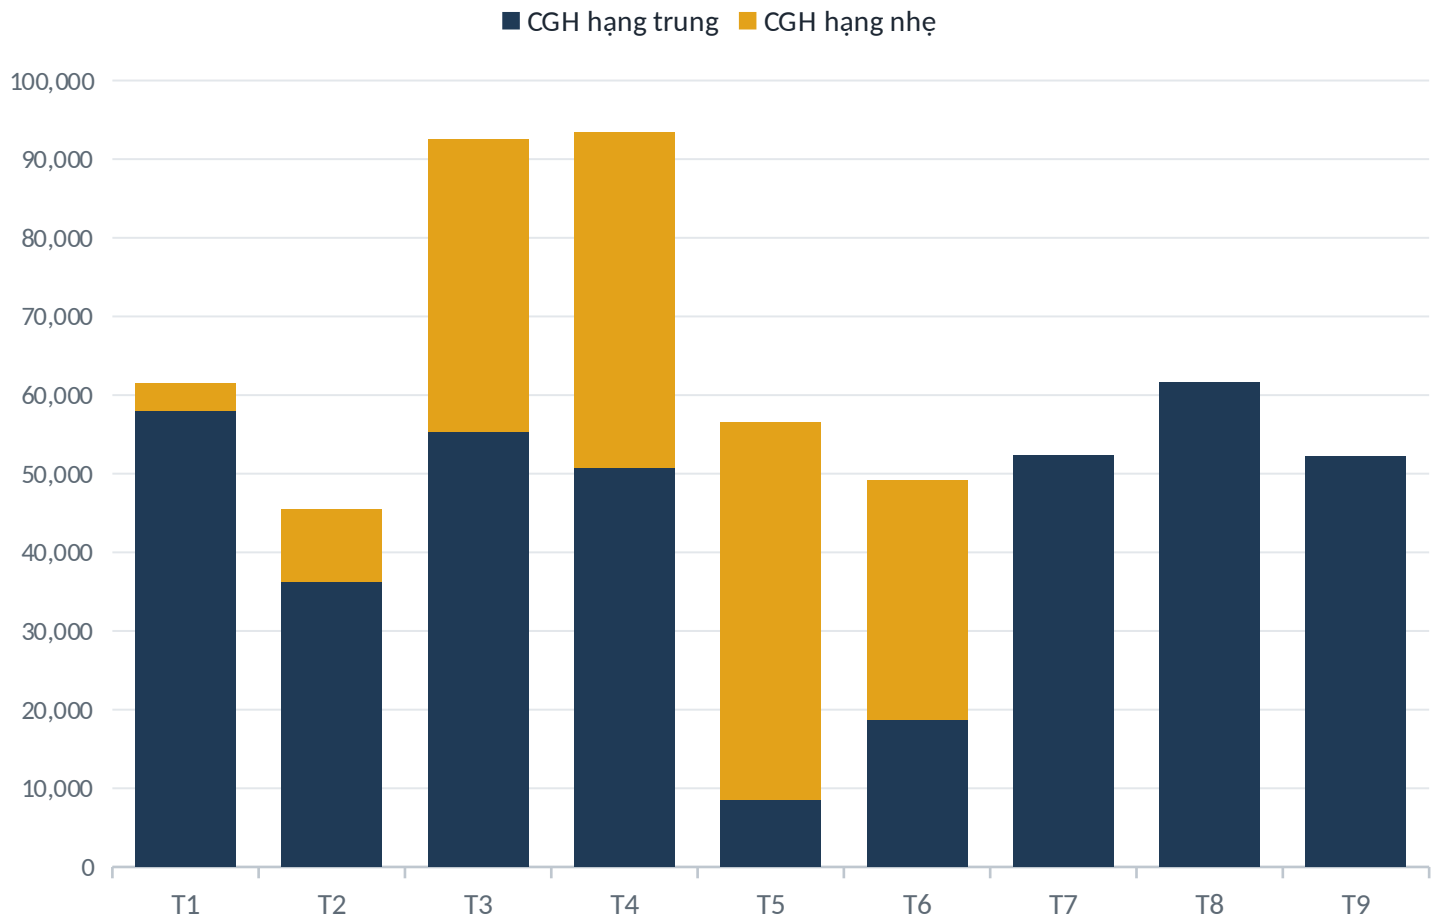

Kỳ	Hạng trung	Hạng nhẹ	Cộng CGH
Quý I	149.506,7	49.948,2	199.454,9
Quý II	78.034,4	121.145,9	199.180,2
Quý III	166.179,8	0,0	166.179,8
9 tháng	**393.720,9**	**171.094,1**	**564.815,0**
% KH	**92,4**	**55,9**	**77,2**

NHẬN XÉT


- CGH hạng trung đạt 92,4% KH năm – đã vượt tiến độ.
- Tháng 5, 6 CGH hạng trung giảm mạnh (8.552,7 t; 18.726,8 t).
- CGH hạng nhẹ không có sản lượng tháng 7, 8, 9.

Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 20–22, cột G:Q; sheet TKV dòng 193 (PX7 CGH2: 207.793,0 t; PX8 CGH1: 357.021,9 t).


Lò chợ giá khung, giá xích đạt 69,7%; giàn mềm ZRY đạt 49,3% KH

Đơn vị: tấn. Biểu đồ trái: giá khung, giá xích; biểu đồ phải: giàn mềm ZRY và DVPT, ngang nghiêng.

Giá khung, giá xích (tấn)

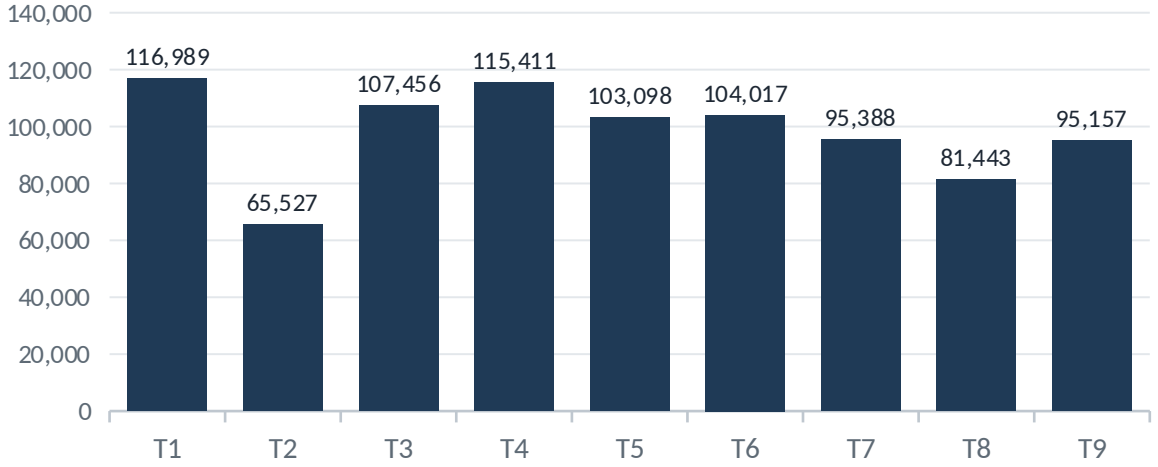

Giàn mềm ZRY và DVPT (tấn)

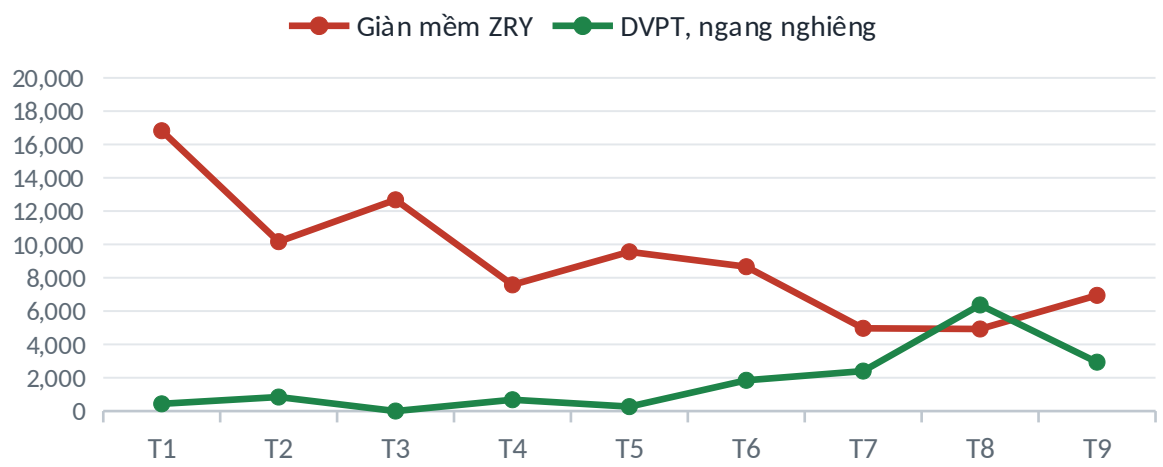


Công nghệ	KH năm	Quý I	Quý II	Quý III	9 tháng	% KH
Giá khung, giá xích	1.269.200	289.972,4	322.525,6	271.987,8	**884.485,8**	**69,7**
Giàn mềm ZRY	167.000	39.665,9	25.787,9	16.829,6	**82.283,4**	**49,3**
DVPT, ngang nghiêng	15.000	1.271,8	2.787,1	11.697,4	**15.756,3**	**105,0**

Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 23, 24, 25, cột G:Q, E. Lò chợ giàn mềm ZRY do PX3 thực hiện (sheet TKV ô I192).

Than đào lò CBSX đạt 76,2% KH; than xén, hạ nền vượt KH năm

Đơn vị: tấn.

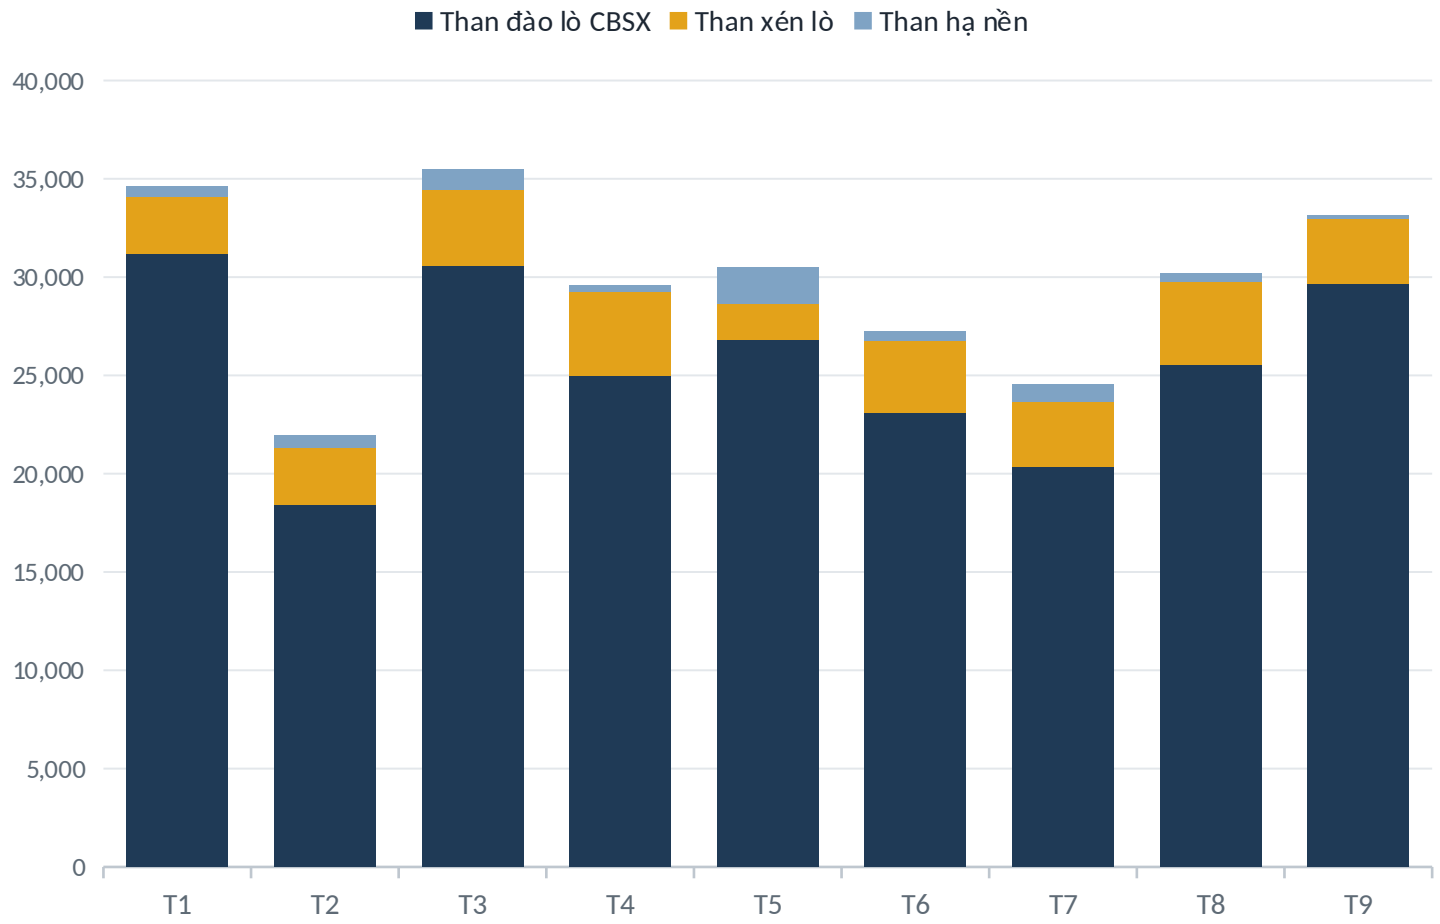

Chỉ tiêu	KH năm	TH 9T	% KH
Than đào lò CBSX	302.680	**230.692,3**	**76,2**
Than xén lò		30.203,8	
Than hạ nền		6.376,2	
Cộng xén + hạ nền	**14.120**	**36.580,0**	**259,1**


NHẬN XÉT

- Than đào lò bình quân 12,7 tấn/m lò đào CBSX.
- Tháng 9 than đào lò đạt 29.649,0 t, cao nhất từ tháng 4.
- KH than xén, hạ nền chỉ 14.120 t – đề nghị xem lại khi lập KH năm 2027.

Nguồn: sheet TKV dòng 116, 117, 118, cột G:O; KH: sheet PHU_LUC ô E27, E28. Than/m lò = 230.692,3 ÷ 18.202,4.

Mét lò đào theo vật liệu chống: chống neo gần như dừng trong quý III

Đơn vị: m. So với KH năm theo QĐ 2675.

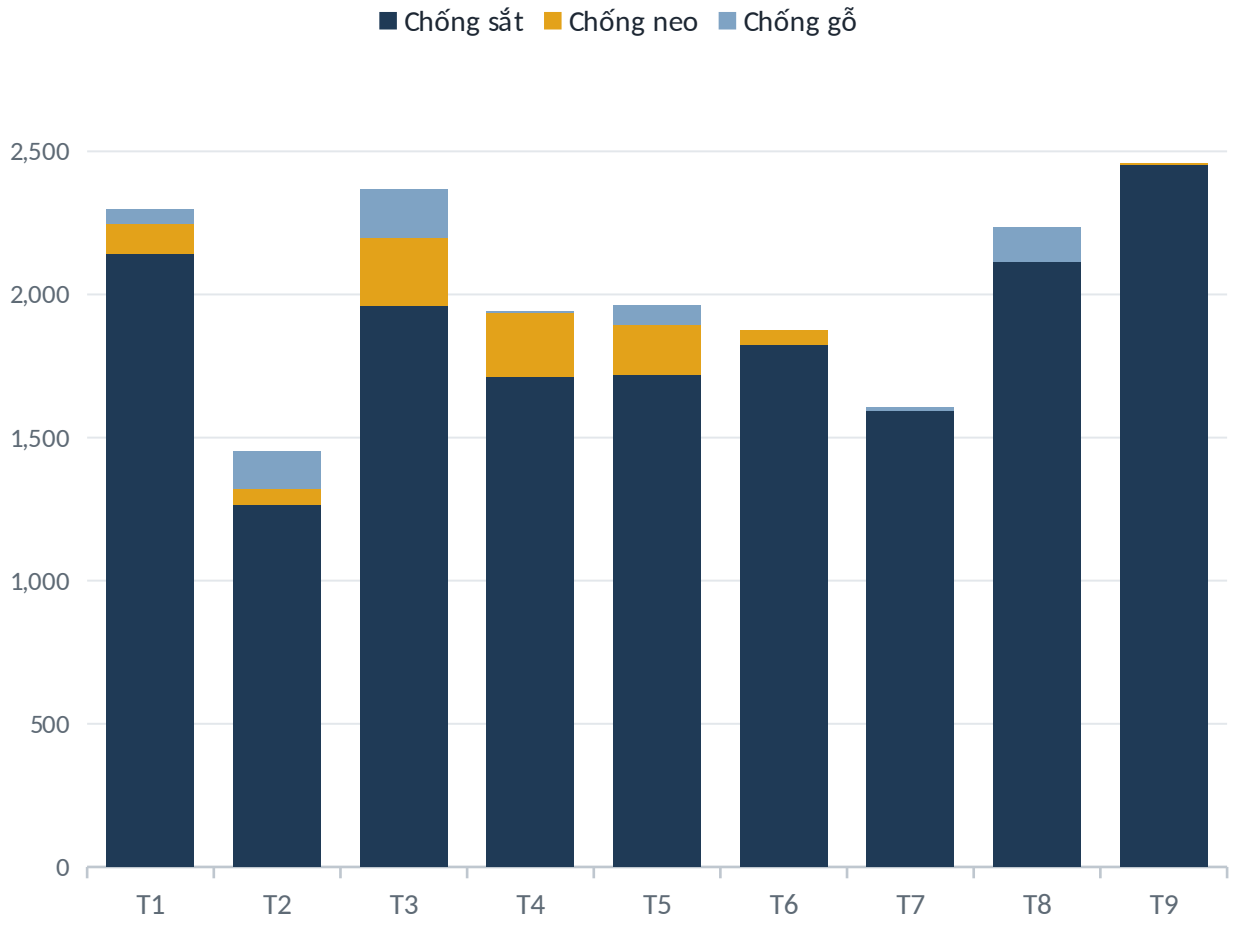

Vật liệu	KH năm	Quý I	Quý II	Quý III	9 tháng	% KH
Chống sắt	24.310	5.366,7	5.252,2	6.163,1	**16.782,0**	69,0
Chống neo	1.000	401,5	454,5	5,6	**861,6**	86,2
Chống gỗ	920	352,2	73,0	133,6	**558,8**	60,7
Cộng	**26.230**	**6.120,4**	**5.779,7**	**6.302,3**	**18.202,4**	69,4


NHẬN XÉT

- Chống neo: quý I 401,5 m, quý II 454,5 m, quý III chỉ 5,6 m (tháng 9).
- Lò chống neo 9 tháng đạt 86,2% KH năm nhờ khối lượng 6 tháng đầu năm.
- Lò chống sắt chiếm 92,2% tổng mét lò đào.

Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 66–69, cột G:Q, E. Lò chống sắt = tổng mét lò đào − chống neo − chống gỗ.

Cơ giới hóa đào lò: combai EBH-45 dừng từ tháng 6, bán CGH đạt 87,0% KH

Đơn vị: m. EBH-45: đào CGH đồng bộ lò than (PX12 – CGĐB); bán CGH: xe khoan + máy xúc (PX13 – BCG và HL1).

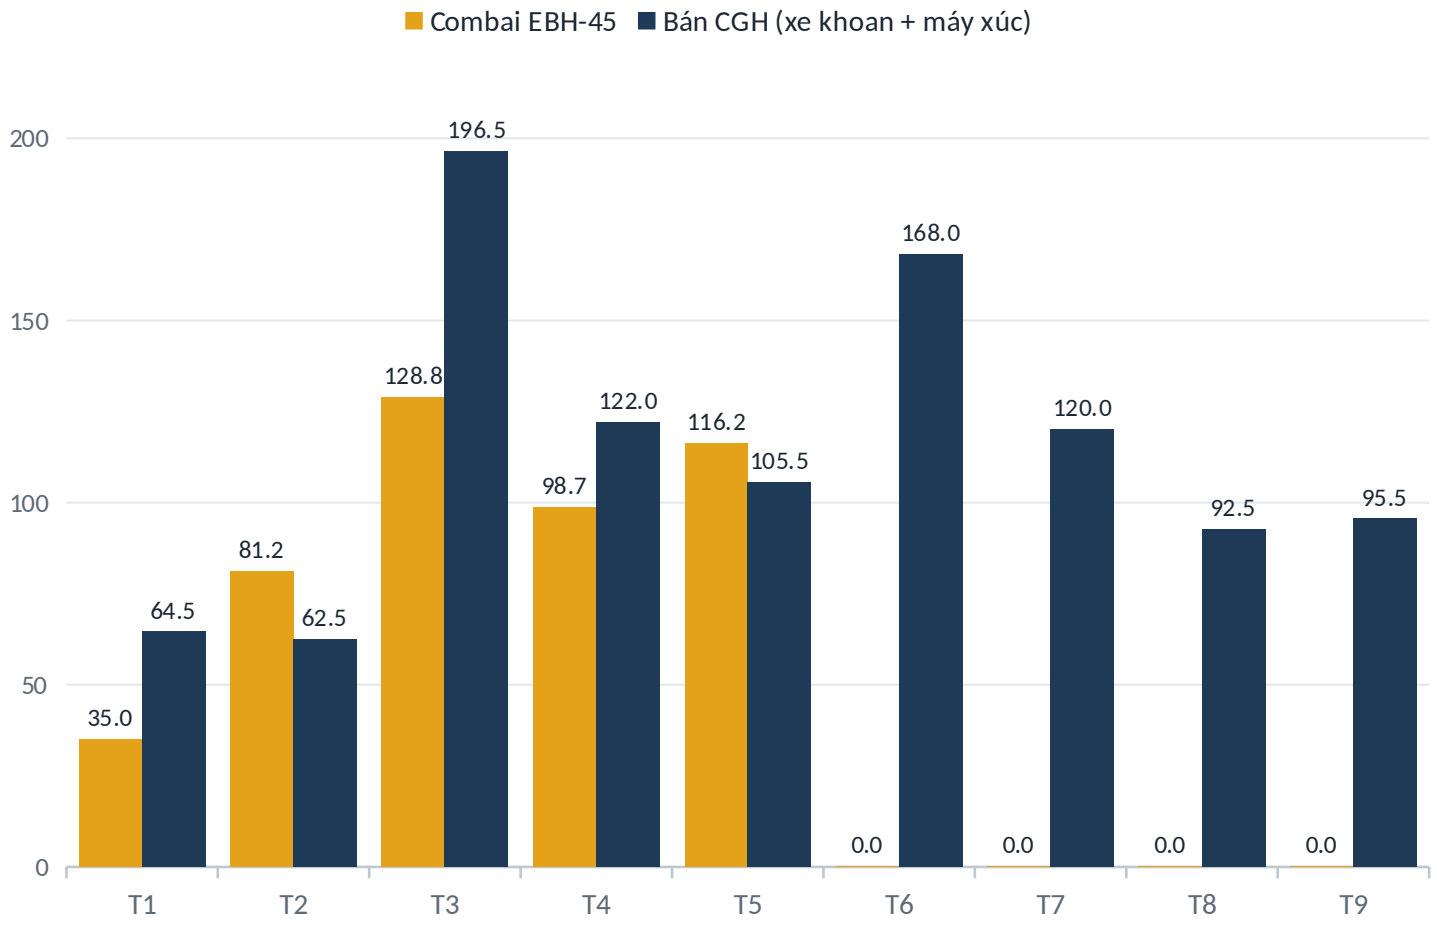

Chỉ tiêu	KH năm	TH 9T	% KH	BQ/ tháng
Combai EBH-45	1.200	**459,9**	**38,3**	51,1
Bán CGH	1.180	**1.027,0**	**87,0**	114,1


NHẬN XÉT

- EBH-45 thực hiện 459,9 m trong tháng 1–5; tháng 6–9 không có khối lượng.
- Để đạt KH năm, quý IV EBH-45 phải đào 740,1 m (246,7 m/tháng).
- Bán CGH ổn định, BQ 114,1 m/tháng; còn 153,0 m để đạt KH năm.
- Tỷ lệ đào lò cơ giới hóa (EBH + bán CGH) = 8,2% tổng mét lò đào.

Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 64, 65, cột G:Q, E; sheet TKV dòng 205, 206 (theo phân xưởng).

Đào lò tự làm 86,2%, thuê ngoài 13,8%

Đơn vị: m.

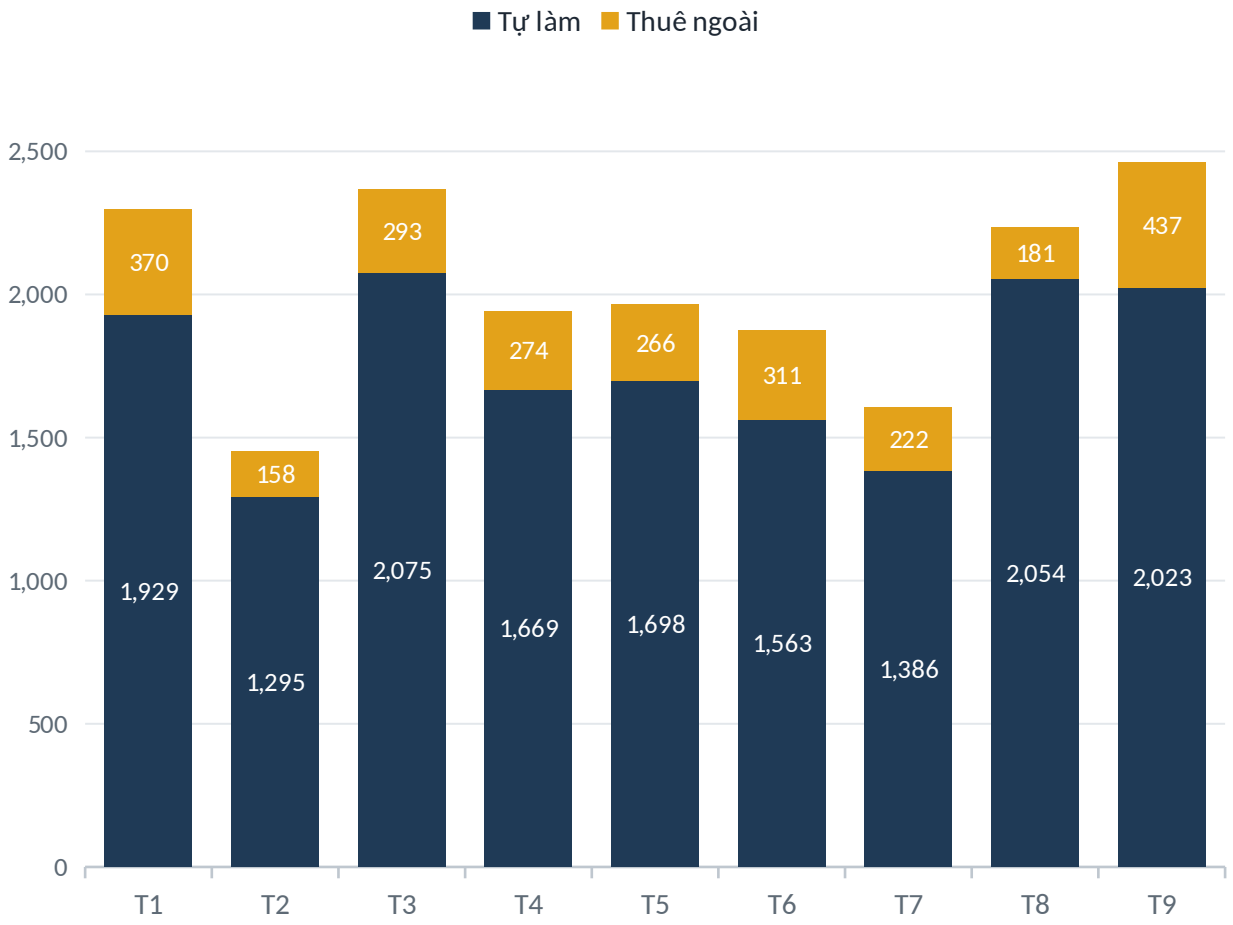

Chỉ tiêu	Tự làm	Thuê ngoài	Cộng	% thuê ngoài
Mét lò đào CBSX	15.691,1	2.511,3	**18.202,4**	**13,8**
– Lò đá	4.201,95	2.007,7	6.209,65	**32,3**
– Lò than	11.489,15	503,6	11.992,75	4,2
Mét lò xén	4.379,7	771,0	**5.150,7**	**15,0**


NHẬN XÉT

- Thuê ngoài tập trung đào lò đá: 32,3% khối lượng lò đá.
- Tháng 9 thuê ngoài đạt 437,0 m, cao nhất từ đầu năm.
- Đơn vị thuê ngoài: HL1, PTH, QN, VN.

Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 40–41, 56–57, 60–61, 93–94 (cộng cột G:Q). Lưu ý: ô V56, V57, V60, V61 không khớp cộng tháng – báo cáo dùng số cộng tháng (khớp sheet TKV ô AF/AG 167, 171).

Gia cố đường lò: neo cáp, chống đội vượt KH; ép vữa, ép hóa chất, bê tông chậm

Đơn vị: m. So với PA kỹ thuật gia cố đường lò năm 2026 số 5342/TKCM-KCM. Biểu đồ: % hoàn thành KH năm.

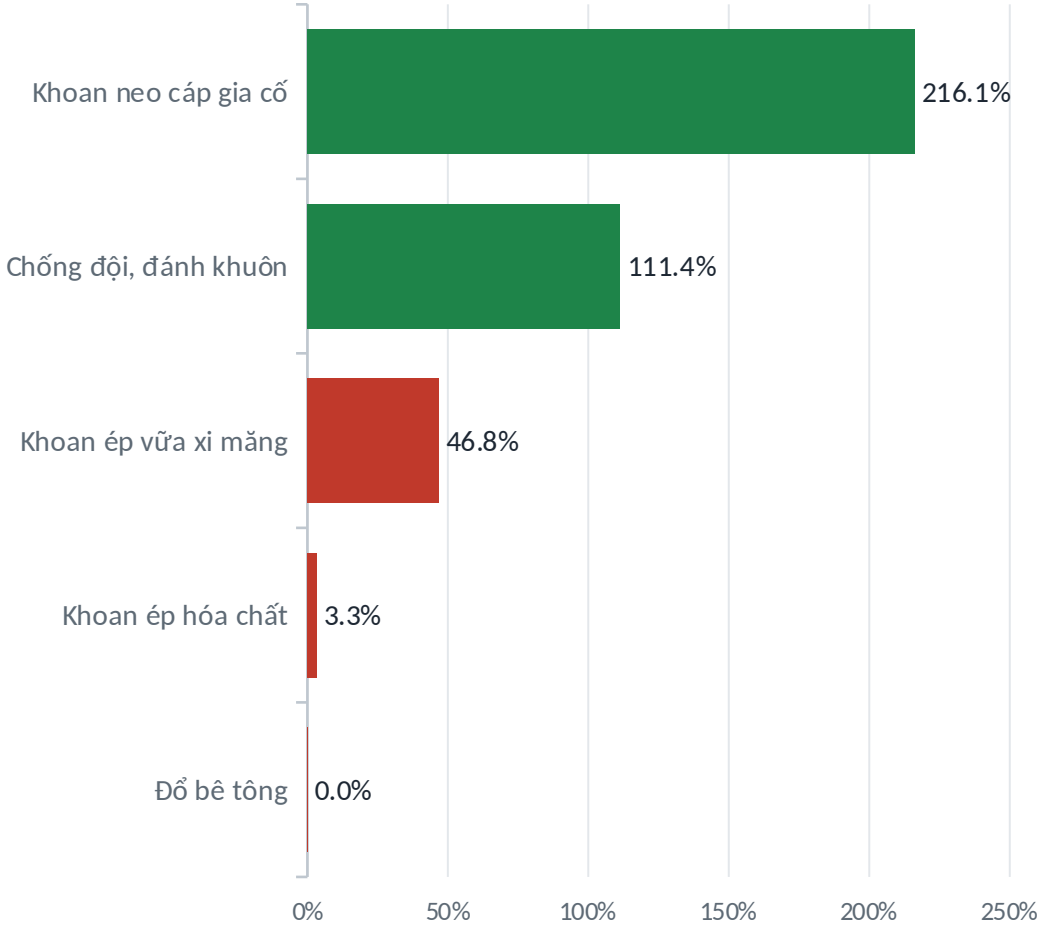

Hạng mục	KH năm	Quý I	Quý II	Quý III	9 tháng	% KH
Khoan neo cáp gia cố	750	922,8	455,2	243,0	**1.621,0**	**216,1**
Chống đội, đánh khuôn	1.000	631,9	354,3	127,8	**1.114,0**	**111,4**
Khoan ép vữa xi măng	700	184,5	93,5	49,5	**327,5**	**46,8**
Khoan ép hóa chất	300	0,0	10,0	0,0	**10,0**	**3,3**
Đổ bê tông	1.100	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
Chống dặm	–	41,4	0,0	6,0	47,4	–

NHẬN XÉT

- Quý III: ép vữa 49,5 m, ép hóa chất 0 m, đổ bê tông 0 m.
- Khối lượng neo cáp, chống đội giảm mạnh trong tháng 8, 9.
- Ô cột V sheet PHU_LUC ghi tay (neo cáp 1.800; ép vữa 500; chống đội 1.300; ép HC 175; bê tông 625) không khớp cộng tháng – báo cáo dùng số cộng tháng.

Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 110–115, cột G:Q, E; đối chiếu sheet TKV dòng 130, 131, 136–138.

Tiêu hao vật tư chủ yếu 9 tháng năm 2026

So với định mức KH năm (QĐ 2675). Tỷ lệ < 100% là tiết kiệm so với KH.

Vật tư	ĐVT	KH	TH 9 tháng	Tỷ lệ %
Thuốc nổ trong hầm lò	kg/10³T	209,80	153,00	**72,9**
– Khai thác lò chợ	kg/10³T	94,03	71,07	75,6
– Đào lò than	kg/m	6,40	4,37	68,3
– Đào lò đá	kg/m	22,26	14,88	66,9
Gỗ khai thác hầm lò	m³/10³T	7,68	6,27	**81,6**
– Lò chợ	m³/10³T	5,32	4,77	89,7
– Lò CBSX chống gỗ	m³/m	0,65	0,50	77,1
– Lò CBSX chống sắt	m³/m	0,25	0,16	63,5
Thép chống lò	kg/m	522,00	530,20	**101,6**
Điện năng	KW/10³T	25,56	24,67	**96,5**
Dầu nhũ hóa	Lít/10³T	127,80	111,42	**87,2**
Lưới thép B50	kg/10³T	561,60	406,07	**72,3**

Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 143–156 (cột D: ĐVT, E: KH, V: TH, W: tỷ lệ).

NHẬN XÉT

- Thuốc nổ, gỗ, điện năng, dầu nhũ hóa, lưới thép đều thấp hơn định mức KH.
- Thép chống lò 530,2 kg/m, vượt KH 522 kg/m (101,6%).
- Thuốc nổ hầm lò 153,0 kg/10³T, bằng 72,9% KH.

LƯU Ý ĐỘ TIN CẬY

Các ô tiêu hao trong sheet PHU_LUC (cột V) không có số chi tiết tháng để đối chiếu; một số ô tháng báo lỗi #VALUE!/#REF!. Đề nghị bộ phận vật tư xác nhận trước khi dùng chính thức.

III


PHẦN III

KẾT QUẢ THEO PHÂN XƯỞNG

- 11 phân xưởng khai thác: sản lượng, cơ cấu công nghệ lò chợ
- 6 phân xưởng đào lò và đơn vị thuê ngoài
- Lưu ý: file chưa có KH giao theo phân xưởng nên chưa đánh giá % hoàn thành từng đơn vị

Than 11 phân xưởng khai thác: 1.656.144,6 tấn = 91,3% sản lượng Công ty

Đơn vị: tấn, lũy kế 9 tháng. Màu vàng: 2 phân xưởng cơ giới hóa.

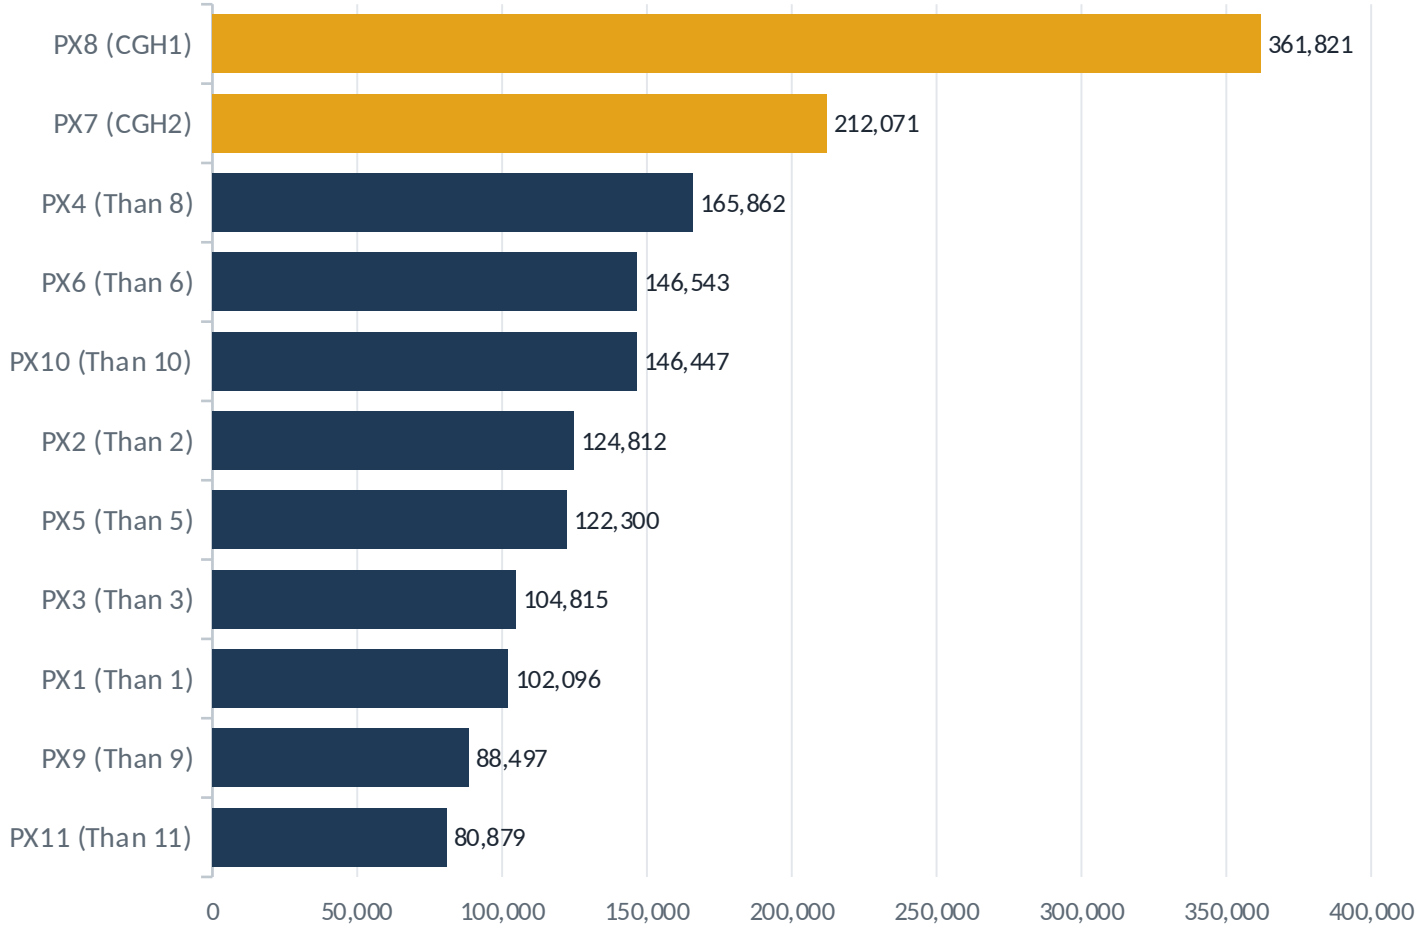

Phân xưởng	Than NK (t)	Tỷ trọng %
PX8 (CGH1)	361.820,6	19,9
PX7 (CGH2)	212.071,4	11,7
PX4 (Than 8)	165.862,2	9,1
PX6 (Than 6)	146.543,2	8,1
PX10 (Than 10)	146.446,8	8,1
Cộng 11 PX	**1.656.144,6**	**91,3**

NHẬN XÉT

- PX8 (CGH1) và PX7 (CGH2) đạt 573.891,9 t, chiếm 31,6% sản lượng Công ty.
- Thấp nhất: PX11 (80.879,4 t), PX9 (88.497,5 t).

Nguồn: sheet TKV dòng 185, cột G:Q (bảng tổng hợp theo PX; tiêu đề ghi "8 tháng" nhưng số là lũy kế 9 tháng, đã đối chiếu khớp tổng).

Phân xưởng khai thác: sản lượng lò chợ theo công nghệ, mét lò đào, mét lò xén

Lũy kế 9 tháng. Đơn vị: tấn, m.


Phân xưởng	Than NK (t)	Lò chợ (t)	Giá khung, xích	CGH	ZRY	DVPT	Lò đào (m)	Lò xén (m)
PX1 (Than 1)	102.096,5	89.481,8	86.412,1	0,0	0,0	3.069,7	994,8	65,0
PX2 (Than 2)	124.812,2	117.331,3	116.142,7	0,0	0,0	1.188,5	591,1	137,9
PX3 (Than 3)	104.814,8	89.376,1	0,0	0,0	82.283,4	7.092,7	972,6	230,0
PX4 (Than 8)	165.862,2	155.934,9	155.934,9	0,0	0,0	0,0	807,0	185,9
PX5 (Than 5)	122.300,0	111.326,1	110.234,3	0,0	0,0	1.091,8	962,4	134,2
PX6 (Than 6)	146.543,2	140.093,6	138.821,8	0,0	0,0	1.271,8	367,5	299,4
PX7 (CGH2)	212.071,4	207.793,0	0,0	**207.793,0**	0,0	0,0	122,4	203,6
PX8 (CGH1)	361.820,6	357.021,9	0,0	**357.021,9**	0,0	0,0	124,8	149,9
PX9 (Than 9)	88.497,5	76.712,8	76.311,4	0,0	0,0	401,4	839,3	117,2
PX10 (Than 10)	146.446,8	133.185,2	131.544,9	0,0	0,0	1.640,3	832,0	155,9
PX11 (Than 11)	80.879,4	69.083,6	69.083,6	0,0	0,0	0,0	785,7	118,1
Cộng 11 PX	**1.656.144,6**	**1.547.340,5**	**884.485,8**	**564.815,0**	**82.283,4**	**15.756,3**	**7.399,6**	**1.797,1**

Kiểm tra: Than lò chợ 11 PX = 1.547.340,5 t, khớp tổng than lò chợ Công ty (sheet TKV dòng 119). Mét lò đào của PX7, PX8 chủ yếu là lò chống neo (PX7: 113,7/122,4 m; PX8: 124,8/124,8 m).

Nguồn: sheet TKV dòng 156, 175, 185, 188, 190–193, cột G:Q.

6 phân xưởng đào lò: 8.291,5 m lò đào = 45,6% tổng mét lò đào Công ty

Lũy kế 9 tháng. Đơn vị: m, tấn.

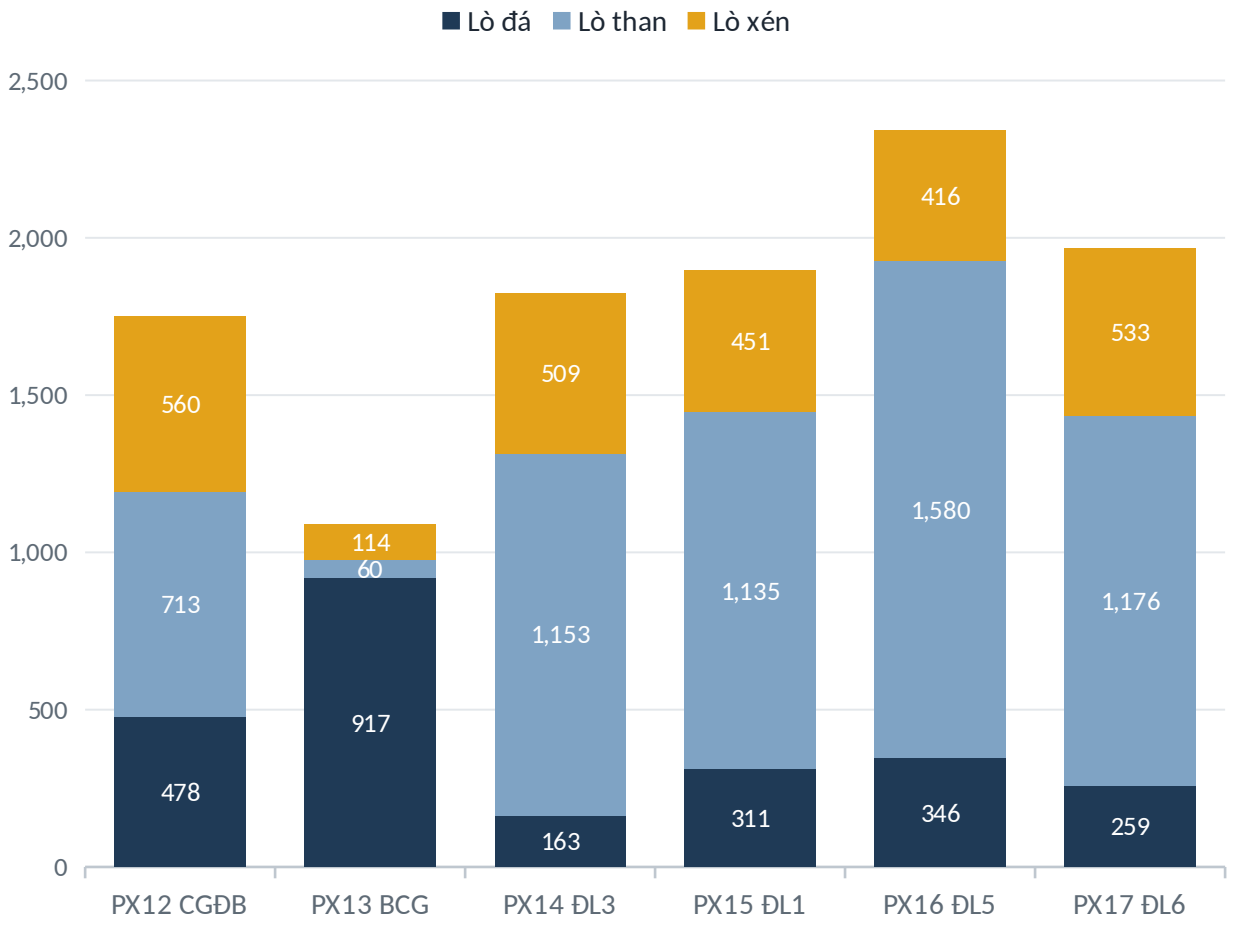

Phân xưởng	Lò đào (m)	Lò đá (m)	Lò xén (m)	Than NK (t)
PX12 (CGĐB)	1.191,5	478,05	559,8	26.296,4
PX13 (BCG)	977,1	**917,40**	114,0	1.408,6
PX14 (ĐL3)	1.315,6	162,70	508,7	28.208,4
PX15 (ĐL1)	1.446,4	311,30	451,0	25.229,1
PX16 (ĐL5)	**1.926,2**	346,30	416,0	35.782,3
PX17 (ĐL6)	1.434,7	258,60	533,1	24.407,6
Cộng 6 PX	**8.291,5**	**2.474,35**	**2.582,6**	**141.332,4**

Nguồn: sheet TKV dòng 156, 167, 175, 185, 205, cột R:W.

NHẬN XÉT


- PX16 (ĐL5) cao nhất: 1.926,2 m lò đào; PX13 (BCG) chủ yếu đào lò đá (917,4 m).
- PX12 (CGĐB) đạt 1.191,5 m, trong đó combai EBH-45 459,9 m.

Đơn vị thuê ngoài và đơn vị phụ trợ

Lũy kế 9 tháng. HL1, PTH, QN, VN là đơn vị thuê ngoài; KSKM, VT1, VT2 là đơn vị phụ trợ (than hạ nền).

Đơn vị	Lò đào (m)	Lò đá (m)	Lò than (m)	Lò xén (m)	Than NK (t)
TN (HL1)	**2.249,3**	1.890,3	359,0	65,5	10.559,6
PTH	43,3	0,0	43,3	30,0	859,3
QN	130,7	29,4	101,3	569,0	4.215,0
VN	88,0	88,0	0,0	106,5	1.053,8
KSKM	0,0	0,0	0,0	0,0	141,5
VT1	0,0	0,0	0,0	0,0	49,2
VT2	0,0	0,0	0,0	0,0	257,4
Cộng	**2.511,3**	**2.007,7**	**503,6**	**771,0**	**17.135,8**

Cơ cấu mét lò đào theo nhóm đơn vị (m)

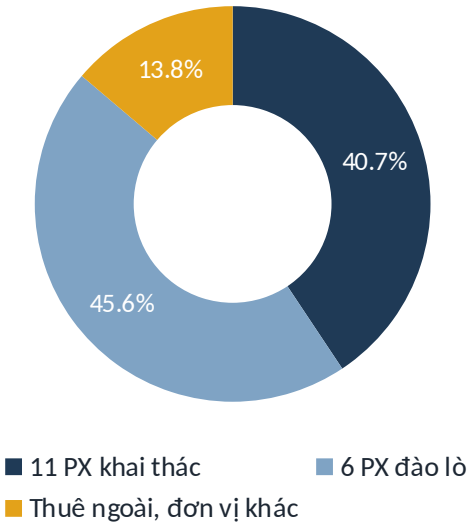

NHẬN XÉT

- HL1 đào 2.249,3 m, trong đó lò đá 1.890,3 m – đơn vị thuê ngoài lớn nhất.
- Kiểm tra: 7.399,6 + 8.291,5 + 2.511,3 = 18.202,4 m.

Nguồn: sheet TKV dòng 156, 167, 171, 175, 185, cột X:AD.

IV

PHẦN IV

TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN – NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP QUÝ IV

- Những tồn tại thể hiện qua số liệu
- Nguyên nhân
- Khối lượng phải thực hiện quý IV
- Giải pháp, kiến nghị

Những tồn tại thể hiện qua số liệu

1. **Sản lượng, mét lò đào, mét lò xén**
   Đạt 72,6% / 69,4% / 68,7% KH (QĐ 2675) – dưới tiến độ 75%

2. **Sản lượng quý III giảm**
   Quý III 554.613,3 t, giảm 82.975,1 t so với quý II

3. **Lò chợ CGH hạng nhẹ**
   Không có sản lượng quý III; 9 tháng đạt 55,9% KH

4. **Lò chợ giàn mềm (ZRY)**
   Đạt 49,3% KH; quý III 16.829,6 t (quý I: 39.665,9 t)

5. **Combai EBH-45, chống neo**
   EBH-45 đạt 38,3%, dừng từ tháng 6; chống neo quý III 5,6 m

6. **Mét lò xén trong than**
   Đạt 50,5% KH (xén trong đá 84,1%)

7. **Chất lượng than**
   Độ tro 38,1%, vượt KH 1,6 điểm %

8. **Gia cố đường lò**
   Ép vữa 46,8%, ép hóa chất 3,3%, đổ bê tông chưa thực hiện

Nguồn: tổng hợp từ các slide 5–22.

Nguyên nhân

Phòng KCM bổ sung nguyên nhân cụ thể – file số liệu KLM không có thông tin nguyên nhân nên chưa điền.


TT	Tồn tại	Nguyên nhân (khách quan / chủ quan)
1	**Sản lượng, mét lò đào, mét lò xén**	*[Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]*
2	**Sản lượng quý III giảm**	*[Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]*
3	**Lò chợ CGH hạng nhẹ**	*[Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]*
4	**Lò chợ giàn mềm (ZRY)**	*[Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]*
5	**Combai EBH-45, chống neo**	*[Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]*
6	**Mét lò xén trong than**	*[Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]*
7	**Chất lượng than**	*[Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]*
8	**Gia cố đường lò**	*[Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]*


Nguồn: nội dung nguyên nhân do Phòng KCM và các phân xưởng cung cấp.


Quý IV/2026: bình quân tháng phải tăng 13,3% sản lượng, 32,3% mét lò đào

Còn lại = KH năm − TH 9 tháng; BQ tháng quý IV = còn lại ÷ 3; BQ đã đạt = TH 9 tháng ÷ 9. Mức tăng so với BQ đã đạt (theo QĐ 2675).

Chỉ tiêu	Còn lại (QĐ 2675)	BQ/tháng Q.IV (2675)	Còn lại (3374)	BQ/tháng Q.IV (3374)	BQ đã đạt 9T
Than NK hầm lò (tấn)	685.387,2	**228.462,4**	735.387,2	**245.129,1**	201.623,6
Mét lò đào CBSX (m)	8.027,6	**2.675,9**	7.527,6	**2.509,2**	2.022,5
Mét lò xén (m)	2.349,3	**783,1**	1.974,3	**658,1**	572,3

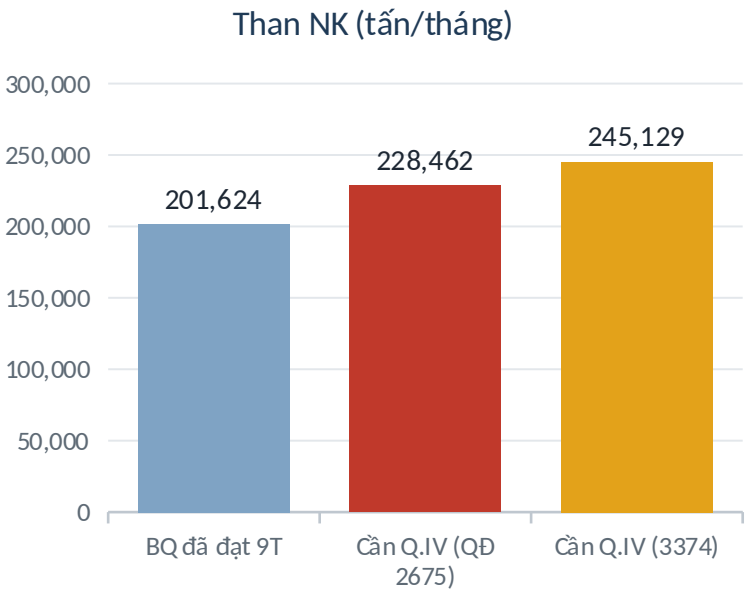

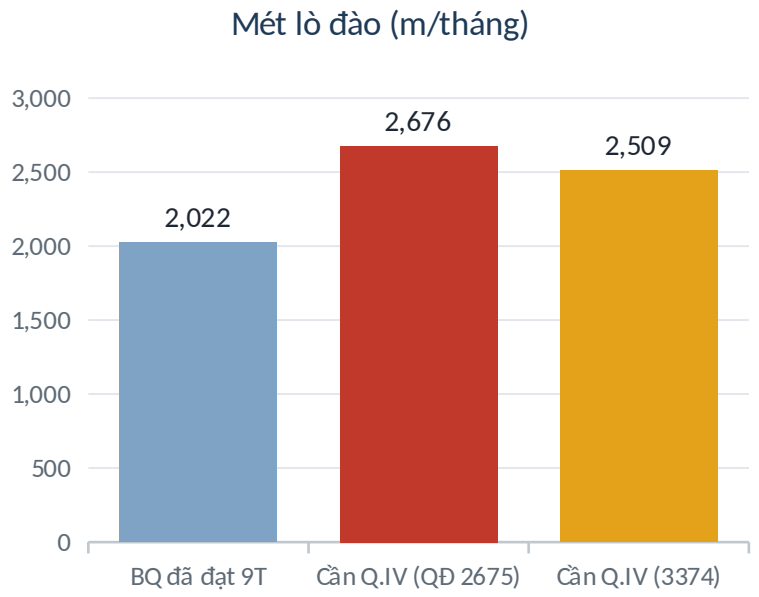

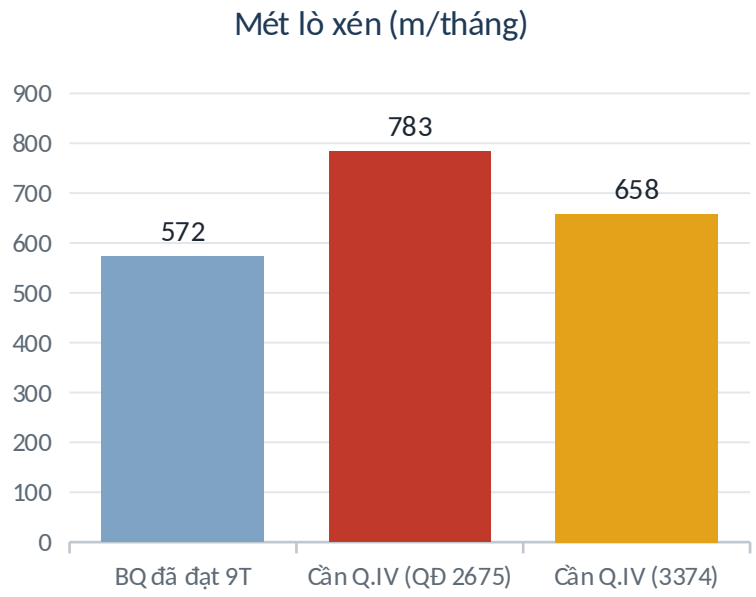

Nguồn: tính từ TH 9 tháng (sheet TKV dòng 85, 104, 114) và KH năm (sheet PHU_LUC cột E, F).

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2026

KHAI THÁC THAN

- Tập trung điều hành lò chợ CGH, giá khung – giá xích (79,9% sản lượng Công ty); giảm thời gian dừng thiết bị.
- Đẩy nhanh chuẩn bị, lắp đặt diện thay thế, không để gián đoạn sản lượng khi chuyển diện.
- Xem xét khôi phục sản xuất lò chợ CGH hạng nhẹ; nâng sản lượng lò chợ giàn mềm (PX3).

ĐÀO LÒ, XÉN LÒ

- Duy trì tốc độ đào lò tháng 9 (2.459,9 m); quý IV cần 2.675,9 m/tháng.
- Ưu tiên các đường lò chuẩn bị diện khai thác năm 2027.
- Đưa combai EBH-45 trở lại hoạt động khi đủ điều kiện; tăng đào lò chống neo; đẩy mạnh xén lò trong than.

KỸ THUẬT, CHẤT LƯỢNG, ĐIỀU HÀNH

- Khai thác chọn lọc, hạn chế lẫn đất đá vách, trụ để đưa độ tro về 36,5%.
- Thực hiện các hạng mục gia cố còn chậm (ép vữa, ép hóa chất, đổ bê tông) theo PA 5342/TKCM-KCM.
- Giao KH quý IV chi tiết đến từng phân xưởng; theo dõi, đánh giá hàng tuần.

[Phòng KCM rà soát, bổ sung giải pháp cụ thể theo từng phân xưởng, diện khai thác.]

KIẾN NGHỊ

Với Giám đốc Công ty

[Kiến nghị với Giám đốc Công ty – Phòng KCM bổ sung]

Với Tập đoàn TKV

[Kiến nghị với Tập đoàn TKV (nếu có)]

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ – Công ty than Dương Huy - TKV
