2027

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2027

Công ty than Dương Huy - TKV · Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ (KCM)

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027 · Quảng Ninh, tháng 10/2026

Nội dung báo cáo

1. Kết quả 9 tháng 2026 và căn cứ lập kế hoạch
2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2027
3. Kế hoạch sản lượng than
4. Kế hoạch đào lò, xén lò
5. Nhận diện thách thức
6. Giải pháp và tổ chức thực hiện

1

Kết quả 9 tháng 2026 và căn cứ lập kế hoạch

Điểm xuất phát của kế hoạch năm 2027

Kết quả 9 tháng 2026: cả 3 chỉ tiêu chính dưới tiến độ 75%

Than NK hầm lò

1.814.612,8 tấn

72,6% KH QĐ 2675 · 71,2% KH 3374
Bình quân 201.623,6 tấn/tháng

Mét lò đào CBSX


18.202,4 m

69,4% KH QĐ 2675 · 70,7% KH 3374
Bình quân 2.022,5 m/tháng

Mét lò xén

5.150,7 m

68,7% KH QĐ 2675 · 72,3% KH 3374
Bình quân 572,3 m/tháng

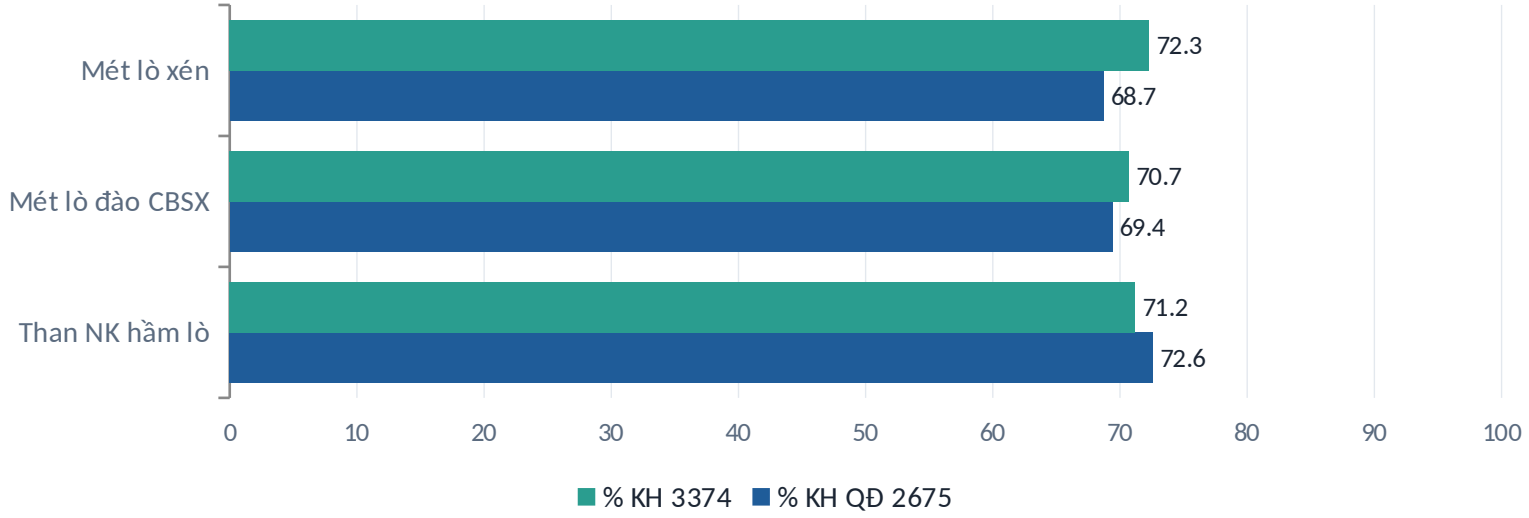

Tiến độ thời gian

75,0%

So với mức 75% KH năm (QĐ 2675): sản lượng còn thiếu 60.387,2 tấn; mét lò đào thiếu 1.470,1 m.

Nguồn: Tổng hợp KLM 9 tháng 2026 (chốt 13/10/2026); KH theo QĐ 2675/QĐ-TKV và 3374/KH-TKV.

Căn cứ và phạm vi lập kế hoạch năm 2027

1

Kế hoạch sản xuất năm 2027

Dự thảo của Phòng KCM (16/10/2026), ban hành kèm Quyết định của Công ty sau khi thông qua.

2

Thời gian làm việc

293 ngày làm việc trong năm; thấp nhất tháng 2 (16 ngày), cao nhất tháng 3 và tháng 7 (27 ngày).

3

Diện khai thác


37 lò chợ thuộc 11 phân xưởng khai thác; 12 lò chợ chuyển tiếp sang năm 2028.

4

Đào, xén lò

162 đường lò đào CBSX; 6 phân xưởng đào lò, Công ty XLM và đơn vị thuê ngoài TKV tham gia.

Số ngày làm việc theo tháng năm 2027

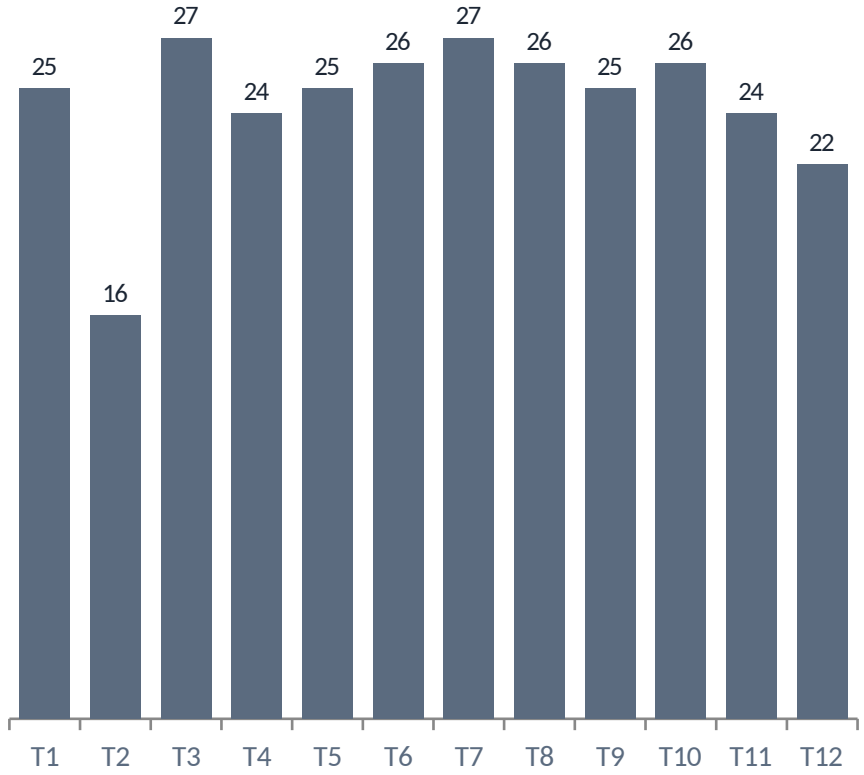

Nguồn: KH sản xuất 2027 (16/10/2026), sheet BIA, KH_LC, KH_ĐL.

2

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2027

Sản lượng, mét lò và chỉ tiêu công nghệ

Năm 2027: 2,5 triệu tấn than và 25.400 m lò đào

Than nguyên khai hầm lò

2.500.000 tấn

BQ 208.333,3 tấn/tháng

Mét lò đào CBSX

25.400 m

Đá 8.421 m · Than 16.979 m

Mét lò xén

7.500 m

Đá 4.086 m · Than 3.414 m

Than lò chợ

2.216.300 tấn

88,7% tổng sản lượng · 37 lò chợ

Hệ số mét lò CBSX

10,16 m/1000 T

KH 2026 (QĐ 2675): 10,49

Mét lò chống neo

1.756 m

6,9% tổng mét lò đào

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TONG_HOP (Phụ lục 1: các chỉ tiêu KTCN chủ yếu).

Bảng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2027	Tỷ trọng (%)
I	**Than nguyên khai hầm lò**	**tấn**	**2.500.000**	**100,0**
1	Than lò chợ	tấn	2.216.300	88,7
	+ Lò chợ máy khấu (CGH)	tấn	780.000	31,2
	+ Lò chợ giá khung, giá xích	tấn	1.281.200	51,2
	+ Lò chợ giàn mềm ZRY	tấn	155.100	6,2
2	Than đào lò, xén lò	tấn	283.700	11,3
II	**Mét lò đào CBSX**	**m**	**25.400**	**100,0**
	+ Lò đá (Sđ bq 16,96 m^2)	m	8.421	33,2
	+ Lò than (Sđ bq 13,21 m^2)	m	16.979	66,8
	+ Đào CGH đồng bộ (combai) / bán CGH	m	1.500 / 1.600	
	+ Chống sắt / neo / gỗ	m	22.692 / 1.756 / 952	
III	**Mét lò xén (tự làm / thuê ngoài)**	**m**	**7.500 (4.633 / 2.867)**	
IV	Hệ số mét lò CBSX	m/1000 T	10,16	
V	Thể trọng than NK hầm lò	tấn/m^3	1,623	

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TONG_HOP.

Kế hoạch sản lượng, mét lò theo tháng và bình quân tháng

Chỉ tiêu	ĐVT	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	Cả năm	BQ tháng
Ngày làm việc	ngày	25	16	27	24	25	26	27	26	25	26	24	22	293	24,4
Than lò chợ	tấn	207.200	132.100	211.900	182.800	190.400	219.400	175.400	173.200	182.800	205.200	169.500	166.400	**2.216.300**	**184.691,7**
Than đào, xén lò	tấn	25.209	19.509	27.209	27.909	27.808	27.508	28.308	25.608	20.808	18.708	18.008	17.108	**283.700**	**23.641,7**
Tổng sản lượng than	tấn	**232.409**	**151.609**	**239.109**	**210.709**	**218.208**	**246.908**	**203.708**	**198.808**	**203.608**	**223.908**	**187.508**	**183.508**	**2.500.000**	**208.333,3**
Mét lò đào CBSX	m	**2.400**	**1.730**	**2.330**	**2.450**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.300**	**1.993**	**1.735**	**1.695**	**1.567**	**25.400**	**2.116,7**
Mét lò xén	m	**639**	**595**	**765**	**808**	**690**	**620**	**635**	**611**	**640**	**564**	**479**	**454**	**7.500**	**625,0**
Than BQ ngày	tấn/ngày	9.296	9.476	8.856	8.780	8.728	9.496	7.545	7.646	8.144	8.612	7.813	8.341	8.532	

Than BQ tháng

208.333,3 tấn

Mét đào BQ tháng

2.116,7 m

Mét xén BQ tháng

625,0 m

Ghi chú: than đào, xén lò và mét lò xén tạm phân bổ đều phần chênh lệch giữa KH năm (sheet TONG_HOP) và cộng tháng trong file (+100 tấn; +235 m) vào 12 tháng, chờ rà soát lại phân bổ chi tiết.

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_LC và KH_ĐL (phân bổ theo tháng).

Kế hoạch theo quý, bình quân quý và bình quân tháng trong quý


Chỉ tiêu	ĐVT	Nội dung	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Cả năm	BQ quý	BQ tháng
Ngày làm việc	ngày	Số ngày	68	75	78	72	293	73,3	24,4
Than lò chợ	**tấn**	**Khối lượng quý**	**551.200**	**592.600**	**531.400**	**541.100**	**2.216.300**	**554.075,0**	**184.691,7**
	tấn/tháng	BQ tháng trong quý	183.733,3	197.533,3	177.133,3	180.366,7			
	%	Tỷ trọng so với năm	24,9	26,7	24,0	24,4	100,0		
Than đào, xén lò	**tấn**	**Khối lượng quý**	**71.927**	**83.225**	**74.724**	**53.824**	**283.700**	**70.925,0**	**23.641,7**
	tấn/tháng	BQ tháng trong quý	23.975,7	27.741,7	24.908,0	17.941,3			
	%	Tỷ trọng so với năm	25,4	29,3	26,3	19,0	100,0		
Tổng sản lượng than	**tấn**	**Khối lượng quý**	**623.127**	**675.825**	**606.124**	**594.924**	**2.500.000**	**625.000,0**	**208.333,3**
	tấn/tháng	BQ tháng trong quý	207.709,0	225.275,0	202.041,3	198.308,0			
	%	Tỷ trọng so với năm	24,9	27,0	24,2	23,8	100,0		
Mét lò đào CBSX	**m**	**Khối lượng quý**	**6.460**	**7.250**	**6.693**	**4.997**	**25.400**	**6.350,0**	**2.116,7**
	m/tháng	BQ tháng trong quý	2.153,3	2.416,7	2.231,0	1.665,7			
	%	Tỷ trọng so với năm	25,4	28,5	26,4	19,7	100,0		
Mét lò xén	**m**	**Khối lượng quý**	**1.999**	**2.118**	**1.886**	**1.497**	**7.500**	**1.875,0**	**625,0**
	m/tháng	BQ tháng trong quý	666,3	706,0	628,7	499,0			
	%	Tỷ trọng so với năm	26,7	28,2	25,1	20,0	100,0		

Ghi chú: than đào, xén lò và mét lò xén tạm phân bổ đều phần chênh lệch giữa KH năm (sheet TONG_HOP) và cộng tháng trong file (+100 tấn; +235 m) vào 12 tháng, chờ rà soát lại phân bổ chi tiết.

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_LC và KH_ĐL.

Bình quân ngày theo tháng: sản lượng than, mét lò đào, xén

Chỉ tiêu	ĐVT	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	Cả năm
Ngày làm việc	ngày	25	16	27	24	25	26	27	26	25	26	24	22	293
Than lò chợ	tấn/ngày	8.288,0	8.256,3	7.848,1	7.616,7	7.616,0	8.438,5	6.496,3	6.661,5	7.312,0	7.892,3	7.062,5	7.563,6	**7.564,2**
Than đào, xén lò	tấn/ngày	1.008,4	1.219,3	1.007,7	1.162,9	1.112,3	1.058,0	1.048,4	984,9	832,3	719,5	750,3	777,6	**968,3**
Tổng sản lượng than	tấn/ngày	**9.296,4**	**9.475,6**	**8.855,9**	**8.779,5**	**8.728,3**	**9.496,5**	**7.544,7**	**7.646,5**	**8.144,3**	**8.611,8**	**7.812,8**	**8.341,3**	**8.532,4**
Mét lò đào CBSX	m/ngày	**96,0**	**108,1**	**86,3**	**102,1**	**96,0**	**92,3**	**88,9**	**88,5**	**79,7**	**66,7**	**70,6**	**71,2**	**86,7**
Mét lò xén	m/ngày	**25,6**	**37,2**	**28,3**	**33,7**	**27,6**	**23,8**	**23,5**	**23,5**	**25,6**	**21,7**	**20,0**	**20,6**	**25,6**

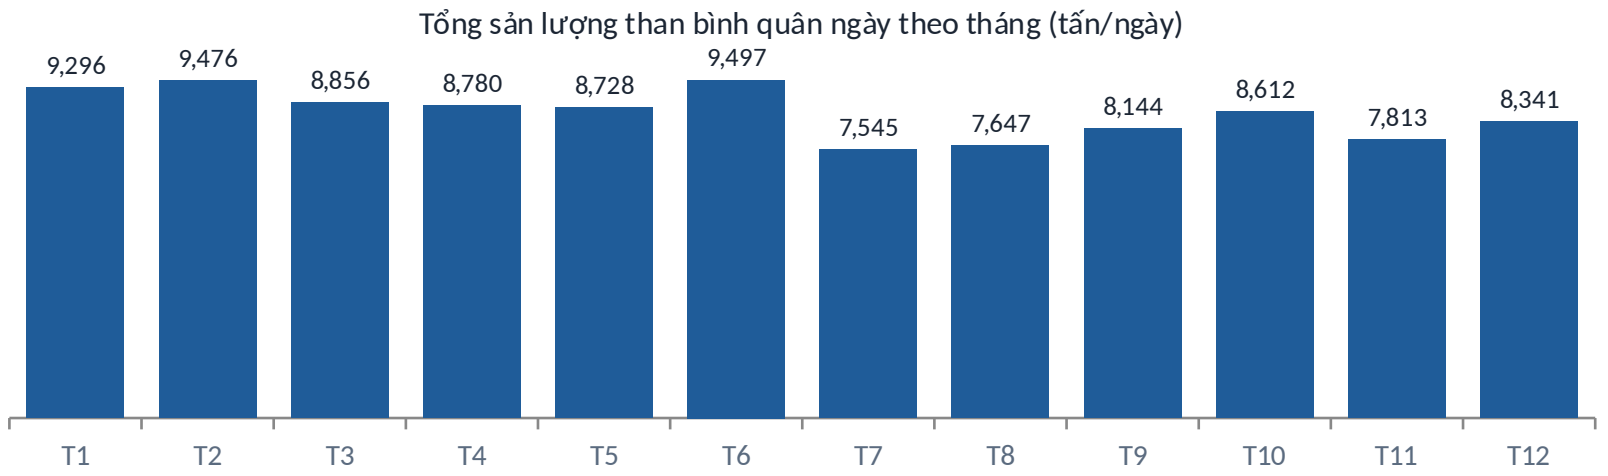

Cao nhất: tháng 6

9.496 tấn/ngày

Thấp nhất: tháng 7

7.545 tấn/ngày

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_LC, KH_ĐL; số ngày làm việc KH_LC dòng 17.

Tổng hợp bình quân ngày, tháng, quý năm 2027

Chỉ tiêu	ĐVT (năm)	Cả năm	BQ quý	BQ tháng	BQ ngày	BQ ngày quý I	BQ ngày quý II	BQ ngày quý III	BQ ngày quý IV
Ngày làm việc	ngày	293	73,3	24,4		68 ngày	75 ngày	78 ngày	72 ngày
Than lò chợ	tấn	2.216.300	554.075,0	184.691,7	**7.564,2**	8.105,9	7.901,3	6.812,8	7.515,3
Than đào, xén lò	tấn	283.700	70.925,0	23.641,7	**968,3**	1.057,8	1.109,7	958,0	747,6
Tổng sản lượng than	tấn	2.500.000	625.000,0	208.333,3	**8.532,4**	9.163,6	9.011,0	7.770,8	8.262,8
Mét lò đào CBSX	m	25.400	6.350,0	2.116,7	**86,7**	95,0	96,7	85,8	69,4
Mét lò xén	m	7.500	1.875,0	625,0	**25,6**	29,4	28,2	24,2	20,8

Than BQ ngày

8.532,4 tấn/ngày

BQ tháng 208.333,3 t · BQ quý 625.000 t

Mét lò đào BQ ngày

86,7 m/ngày

BQ tháng 2.116,7 m · BQ quý 6.350 m

Mét lò xén BQ ngày

25,6 m/ngày

BQ tháng 625,0 m · BQ quý 1.875 m

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TONG_HOP, KH_LC, KH_ĐL.

So với kế hoạch 2026: giữ sản lượng, tăng CGH, giảm mét lò đào

Chỉ tiêu	KH 2026	KH 2027	Chênh lệch	%
Than NK hầm lò (tấn)	2.500.000	2.500.000	0	0,0%
Than lò chợ CGH (tấn)	732.000	780.000	+48.000	+6,6%
Than lò chợ GK, GX (tấn)	1.269.200	1.281.200	+12.000	+0,9%
Than lò chợ ZRY (tấn)	167.000	155.100	-11.900	-7,1%
Than lò chợ DVPT (tấn)	15.000	0	-15.000	-100,0%
Than đào lò CBSX (tấn)	302.680	273.000	-29.680	-9,8%
Mét lò đào CBSX (m)	26.230	25.400	-830	-3,2%
- Lò đá (m)	8.510	8.421	-89	-1,0%
- Lò than (m)	17.720	16.979	-741	-4,2%
Mét lò xén (m)	7.500	7.500	0	0,0%
Mét lò chống neo (m)	1.000	1.756	+756	+75,6%
Đào CGH combai (m)	1.200	1.500	+300	+25,0%
Đào bán CGH (m)	1.180	1.600	+420	+35,6%

Sản lượng

Giữ 2.500.000 tấn; than lò chợ tăng 33.100 tấn (+1,5%), than đào lò giảm 29.680 tấn.

Công nghệ

CGH tăng 48.000 tấn (+6,6%); không còn lò chợ DVPT; ZRY giảm 11.900 tấn.

Đào lò

Giảm 830 m (-3,2%); chống neo tăng 756 m; hệ số mét lò 10,16 (KH 2026: 10,49).


Nguồn: KH 2026: QĐ 2675/QĐ-TKV; KH 2027: sheet TONG_HOP.

Nhịp sản xuất bình quân tháng phải cao hơn 9 tháng 2026

Than NK hầm lò

+3,3%


mức tăng cần đạt so với BQ 9T/2026

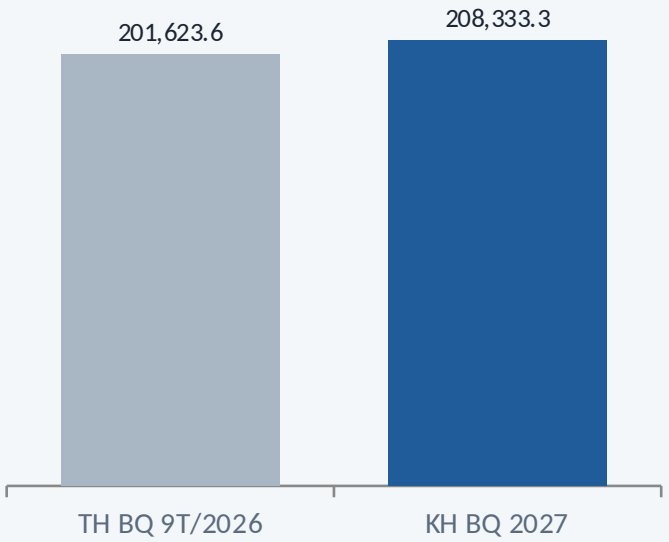

Mét lò đào CBSX

+4,7%

mức tăng cần đạt so với BQ 9T/2026

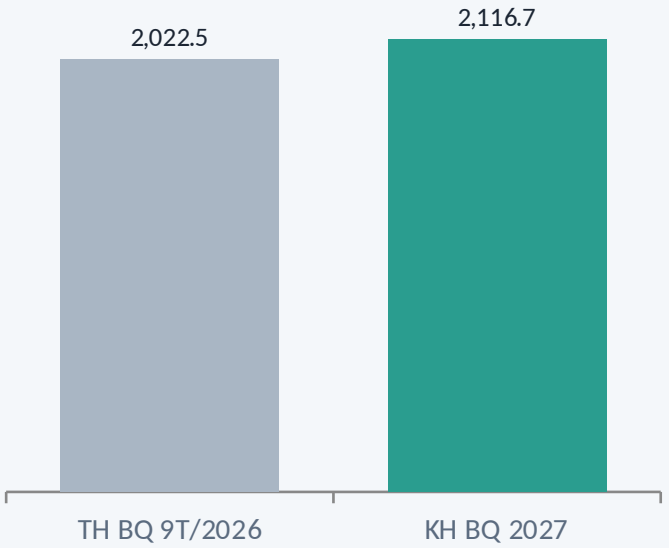

Mét lò xén

+9,2%

mức tăng cần đạt so với BQ 9T/2026




Nguồn: TH 9T/2026: tổng hợp KLM chốt 13/10/2026; KH 2027: sheet TONG_HOP. Đơn vị: than tấn/tháng, mét lò m/tháng.

3

Kế hoạch sản lượng than

2.500.000 tấn · 37 lò chợ · 11 phân xưởng khai thác


Cơ cấu sản lượng: lò chợ chiếm 88,7%, CGH chiếm 31,2%

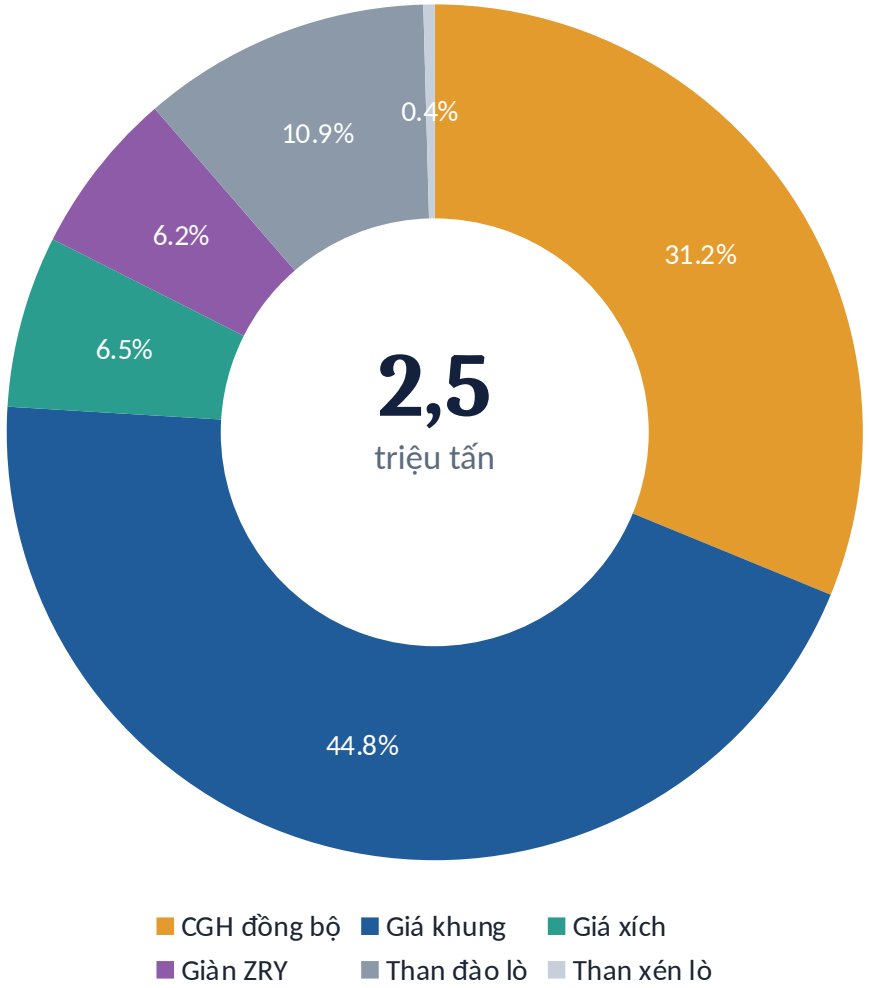

Nguồn sản lượng	Tấn	%
Lò chợ CGH đồng bộ	**780.000**	**31,2**
CGH hạng trung (PX CGH1)	430.000	17,2
CGH hạng nhẹ (PX CGH2)	340.000	13,6
CGH dốc (PX KT3)	10.000	0,4
Lò chợ giá khung	1.118.900	44,8
Lò chợ giá xích	162.300	6,5
Lò chợ giàn mềm ZRY	155.100	6,2
Than đào lò CBSX	273.000	10,9
Than xén lò	10.700	0,4
Tổng cộng	**2.500.000**	**100,0**

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TONG_HOP và TH_G.KHOAN.

Sản lượng theo tháng: cao nhất tháng 6, thấp nhất tháng 2

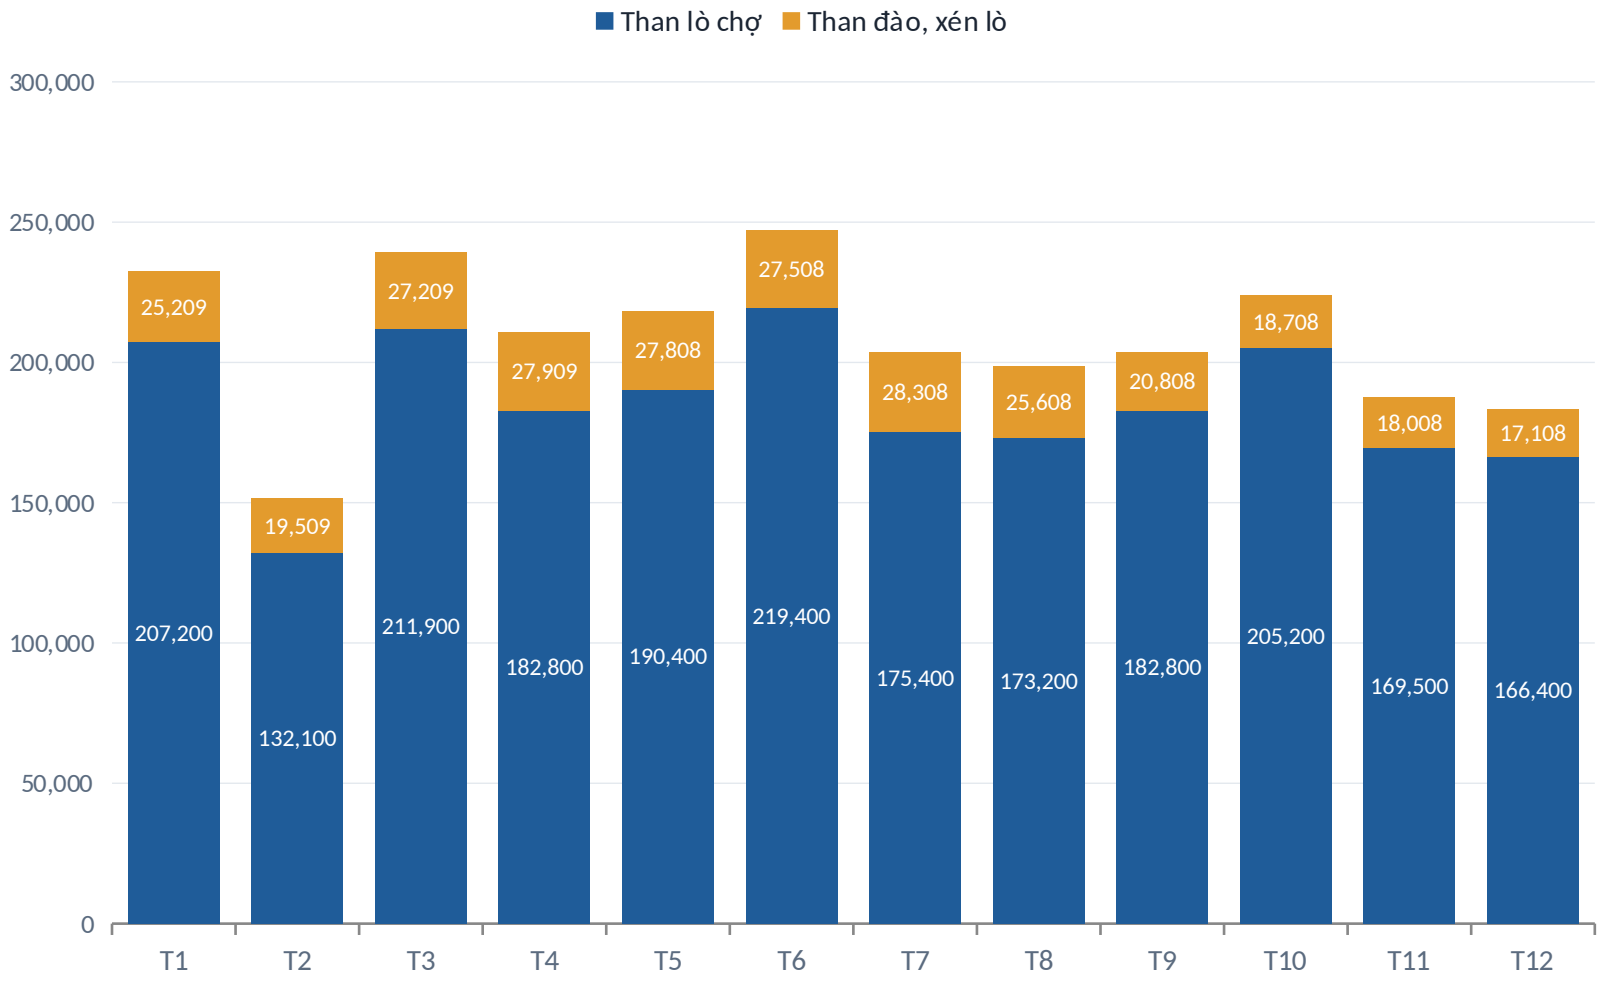

Cao nhất: tháng 6

246.908 tấn

26 ngày làm việc

Thấp nhất: tháng 2

151.609 tấn

16 ngày làm việc (nghỉ Tết)


Bình quân ngày

8.532 tấn/ngày

Dao động 7.545 – 9.496 tấn/ngày

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_LC (lịch thực hiện theo tháng).

Sản lượng theo quý: tập trung cao nhất quý II

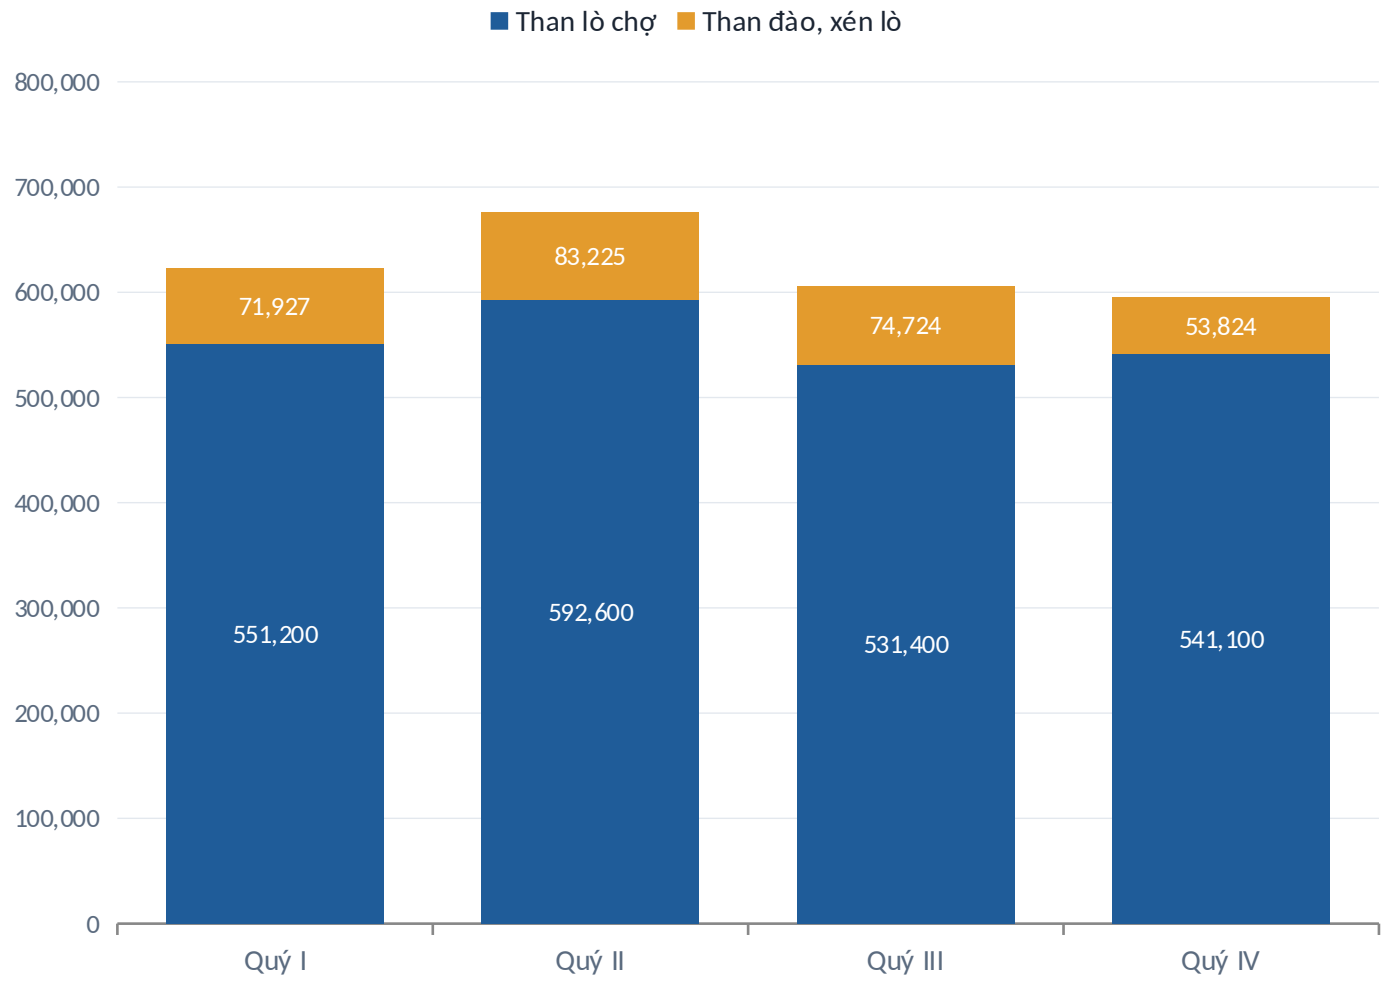


Quý	Tổng (tấn)	% năm	Lũy kế (tấn)	% lũy kế
Quý I	623.127	24,9	623.127	24,9
Quý II	675.825	27,0	1.298.952	52,0
Quý III	606.124	24,2	1.905.076	76,2
Quý IV	594.924	23,8	2.500.000	100,0
Cả năm	**2.500.000**	**100,0**		

Mục tiêu điều hành: hết quý II đạt 52,0% khối lượng năm (1.298.952 tấn).

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_LC (than đào, xén tạm phân bổ đều 100 tấn chênh lệch vào 12 tháng).

Sản lượng giao 11 phân xưởng khai thác

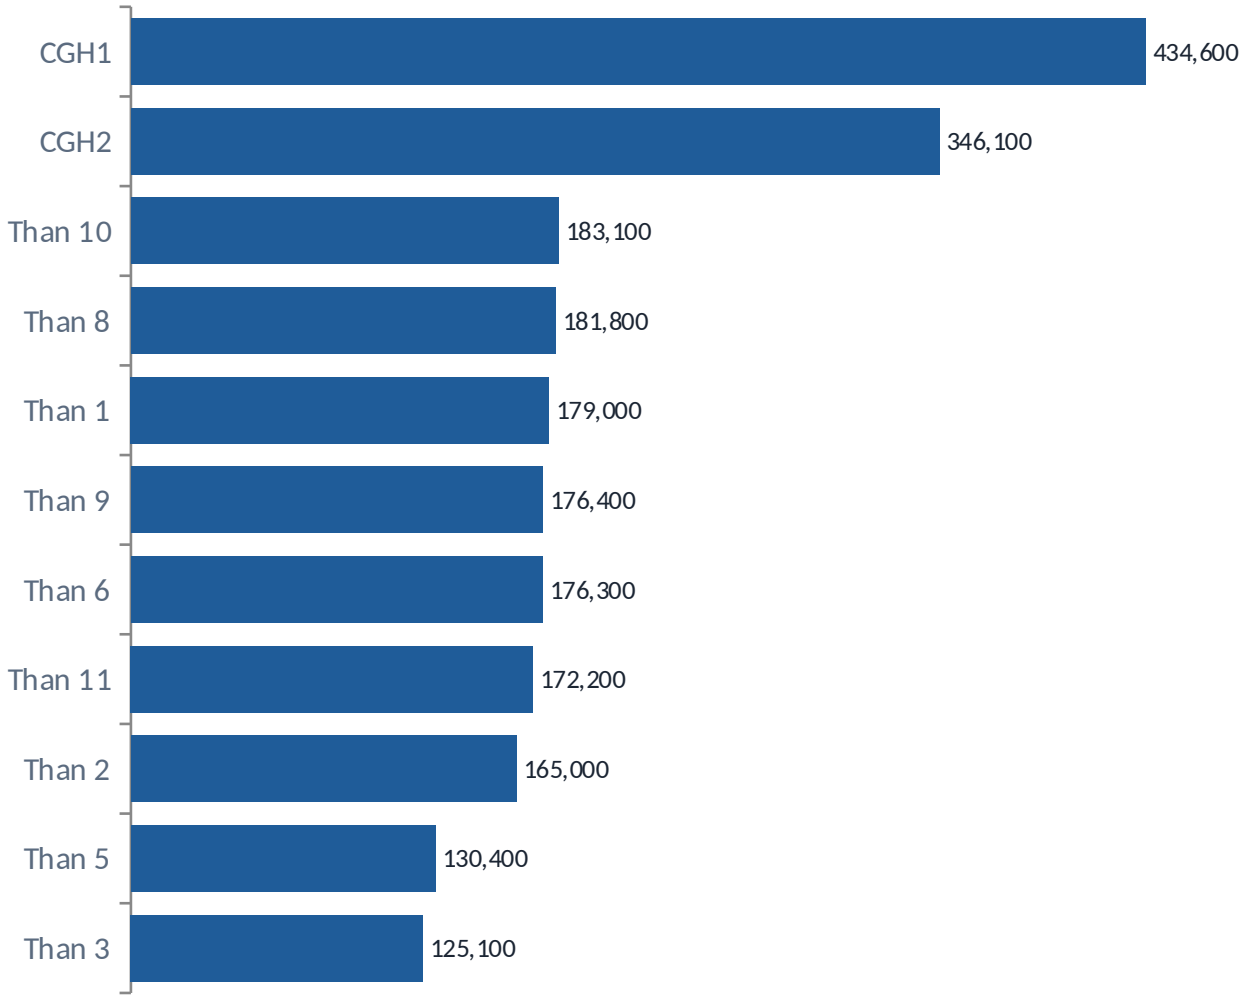

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TH_PX2027.

11 PX khai thác

2.270.000 tấn

90,8% sản lượng Công ty

PX CGH1 + PX CGH2

780.700 tấn

31,2% sản lượng Công ty

Than đào lò của PX đào lò, XLM, thuê ngoài

230.000 tấn

9,2% sản lượng Công ty

Chỉ tiêu sản lượng và công nghệ theo phân xưởng khai thác

TT	Phân xưởng	KH 2027 (tấn)	Lò chợ (tấn)	Đào, xén (tấn)	Số lò chợ	Công nghệ	BQ tháng KH 2027	BQ tháng TH 9T/2026	Tăng (%)
1	Than 1	179.000	170.100	8.900	1	Giá khung	14.917	11.344	+31,5%
2	Than 2	165.000	162.300	2.700	3	Giá xích	13.750	13.868	-0,9%
3	Than 3	125.100	115.400	9.700	6	Giàn ZRY, Giá khung, CGH dốc	10.425	11.646	-10,5%
4	Than 8	181.800	179.900	1.900	5	Giá khung	15.150	18.429	-17,8%
5	Than 5	130.400	128.000	2.400	6	Giàn ZRY, Giá khung	10.867	13.589	-20,0%
6	Than 6	176.300	170.000	6.300	3	Giá khung	14.692	16.283	-9,8%
7	CGH2	346.100	340.000	6.100	3	CGH đồng bộ	28.842	23.563	+22,4%
8	CGH1	434.600	430.000	4.600	3	CGH đồng bộ	36.217	40.202	-9,9%
9	Than 9	176.400	173.700	2.700	2	Giá khung	14.700	9.833	+49,5%
10	Than 10	183.100	178.600	4.500	2	Giá khung	15.258	16.272	-6,2%
11	Than 11	172.200	168.300	3.900	3	Giá khung	14.350	8.987	+59,7%
	Cộng	**2.270.000**	**2.216.300**	**53.700**	**37**		**189.167**	**184.016**	**+2,8%**

Nguồn: KH 2027: sheet TH_PX2027, TH_G.KHOAN, KH_LC; TH 9T/2026: tổng hợp KLM chốt 13/10/2026.

Lịch khai thác 37 lò chợ năm 2027 (1/2)

TT	Phân xưởng	Lò chợ	Công nghệ	SL 2027 (tấn)	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	Chuyển 2028 (tấn)
1	KT1	N-8-3/V8-KN(D2)	Giá khung	170.100	15,5	10,1	16,2	15,1	15,8	16,4	14,3	13,8	13,3	14,3	13,2	12,1	4.900
2	KT2	N-6-5/V6KN	Giá xích	58.700	9,2	5,9	10,9	14,5	15,0	3,2							
3	KT2	N-6-5.1/V6KN	Giá xích	11.500	4,5	2,9	4,1										
4	KT2	N-6-5/V6KN(GD2)	Giá xích	92.100						11,1	14,3	13,8	13,3	14,3	13,2	12,1	153.300
5	KT3	N-10-2.2	Giàn ZRY	12.100	9,8	2,3											
6	KT3	N-10-2A	Giàn ZRY	31.300				9,4	9,8	10,1	2,0						
7	KT3	N-9-3	Giàn ZRY	11.600		3,5	8,1										
8	KT3	N-9-1B	Giá khung	26.100						3,1	10,2	12,8					
9	KT3	N-9-1C	Giàn ZRY	24.300									9,8	11,0	3,5		400
10	KT3	TT-11-10B	CGH dốc	10.000												10,0	38.500
11	KT8	N-6-11	Giá khung	36.000	18,8	12,0	5,2										
12	KT8	N-6-10.1	Giá khung	25.200			11,6	13,6									
13	KT8	N-6-11.1	Giá khung	13.300				2,1	11,2								
14	KT8	N-6-11.2	Giá khung	17.600					3,3	14,3							
15	KT8	ĐB-14-4	Giá khung	87.800							15,4	14,8	14,3	15,6	14,4	13,3	88.000
16	KT5	N-6-8B	Giàn ZRY	12.400	10,0	2,4											
17	KT5	N-6-12.2	Giá khung	34.700		4,2	13,5	13,0	4,0								
18	KT5	N-6-12.3	Giá khung	17.500					8,1	9,4							
19	KT5	ĐB-12-3A	Giàn ZRY	13.300						1,0	10,5	1,8					

Giá khung Giá xích Giàn ZRY CGH (đồng bộ, dốc)

Ô màu: sản lượng tháng (nghìn tấn) · Nguồn: sheet KH_LC

Lịch khai thác 37 lò chợ năm 2027 (2/2)

TT	Phân xưởng	Lò chợ	Công nghệ	SL 2027 (tấn)	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	Chuyển 2028 (tấn)
20	KT5	ĐB-11-4	Giàn ZRY	21.100								8,6	11,5	1,0			
21	KT5	ĐB-11-5	Giàn ZRY	29.000										10,5	9,4	9,1	25.000
22	KT6	TT9-10V9KTT	Giá khung	114.800	16,3	10,4	17,3	16,1	16,3	16,9	16,2	5,3					
23	KT6	TT9-11/V9KTT	Giá khung	44.500								4,3	12,5	14,0	13,2	0,5	
24	KT6	TT9-12B/V9KTT	Giá khung	10.700												10,7	33.600
25	CGH2	TT-9-8A	CGH đồng bộ	106.900	32,5	20,8	35,0	18,6									
26	CGH2	TT-9-9	CGH đồng bộ	188.400					15,0	39,0	35,1	33,8	32,5	33,0			
27	CGH2	TT-10-16	CGH đồng bộ	44.700											18,3	26,4	99.600
28	CGH1	TT-12-6	CGH đồng bộ	103.800	40,0	25,6	38,2										
29	CGH1	TT-8-13	CGH đồng bộ	150.200				37,8	45,0	46,8	20,6						
30	CGH1	TT-8-17	CGH đồng bộ	176.000								20,0	33,0	46,2	43,2	33,6	73.000
31	KT9	TT-5-4A	Giá khung	99.600	17,5	11,2	17,9	16,8	17,5	16,9	1,8						
32	KT9	TT-6-5	Giá khung	74.100							3,9	14,3	13,8	15,4	13,5	13,2	223.700
33	KT10	TT-12-7	Giá khung	53.000	17,5	11,2	17,9	6,4									
34	KT10	TT-11-10	Giá khung	125.600				5,0	15,0	15,6	16,2	15,6	15,0	15,6	14,4	13,2	24.900
35	KT11	TT-8-3C	Giá khung	13.200	13,2												
36	KT11	TT-8-4 (GD1)	Giá khung	56.800	2,4	9,6	16,0	14,4	14,4								
37	KT11	TT-8-4 (GD2)	Giá khung	98.300						15,6	14,9	14,3	13,8	14,3	13,2	12,2	53.700

Giá khung Giá xích Giàn ZRY CGH (đồng bộ, dốc)

Ô màu: sản lượng tháng (nghìn tấn) · Nguồn: sheet KH_LC

Lò chợ CGH: 780.000 tấn, 31,2% sản lượng Công ty

Phân xưởng	Lò chợ	Lc (m)	mv (m)	SL 2027 (tấn)	QI	QII	QIII	QIV	Chuyển 2028
KT3	TT-11-10B	100	2,35	10.000				10.000	38.500
CGH2	TT-9-8A	115	2,70	106.900	88.300	18.600			
CGH2	TT-9-9	115	2,70	188.400		54.000	101.400	33.000	
CGH2	TT-10-16	110	2,55	44.700				44.700	99.600
CGH1	TT-12-6	115	3,00	103.800	103.800				
CGH1	TT-8-13	115	3,24	150.200		129.600	20.600		
CGH1	TT-8-17	115	3,97	176.000			53.000	123.000	73.000
Cộng				**780.000**	**192.100**	**202.200**	**175.000**	**210.700**	**211.100**

CGH hạng trung - PX CGH1

430.000 tấn

3 lò chợ TT-12-6, TT-8-13, TT-8-17

CGH hạng nhẹ - PX CGH2

340.000 tấn

3 lò chợ TT-9-8A, TT-9-9, TT-10-16

CGH dốc - PX KT3

10.000 tấn

Lò chợ TT-11-10B, tháng 12/2027

Diện CGH dự phòng và trữ lượng chuyển tiếp sang năm 2028

Nhóm	Lò chợ	Trữ lượng (tấn)	Huy động 2027 (tấn)	Chuyển 2028 (tấn)	Ghi chú
CGH1 (hạng trung)	TT-12-6	103.800	103.800	0	KT 2027
CGH1 (hạng trung)	TT-8-13	150.200	150.200	0	KT 2027
CGH1 (hạng trung)	TT-8-17	249.000	176.000	73.000	KT 2027
CGH1 (hạng trung)	TT-9-12	223.100	-	223.100	Dự phòng
CGH1 (hạng trung)	TT-5-5	254.400	-	254.400	Dự phòng
CGH1 (hạng trung)	TT-4-1	297.800	-	297.800	Dự phòng
CGH1 (hạng trung)	TT-4-2	297.000	-	297.000	Dự phòng
CGH2 (hạng nhẹ)	TT-9-8A	106.900	106.900	0	KT 2027
CGH2 (hạng nhẹ)	TT-9-9	188.400	188.400	0	KT 2027
CGH2 (hạng nhẹ)	TT-10-16	144.300	44.700	99.600	KT 2027
CGH2 (hạng nhẹ)	TT-10-18	84.000	-	84.000	Dự phòng
CGH2 (hạng nhẹ)	ĐB-14-6A	569.000	-	569.000	Dự phòng
CGH2 (hạng nhẹ)	TT-8-20	259.000	-	259.000	Dự phòng

CGH1 chuyển 2028

1.145.300 tấn

Huy động 2027: 430.000 tấn

CGH2 chuyển 2028

1.011.600 tấn

Huy động 2027: 340.000 tấn

Chuyển tiếp sang 2028 (tất cả công nghệ)

12 lò chợ

Sản lượng còn lại 818.600 tấn

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet DIEN_DP và KH_LC (cột W).


4

Kế hoạch đào lò, xén lò


25.400 m lò đào CBSX · 7.500 m lò xén

Cơ cấu mét lò đào: 66,8% lò than, 89,3% chống sắt

Theo tính chất đất đá

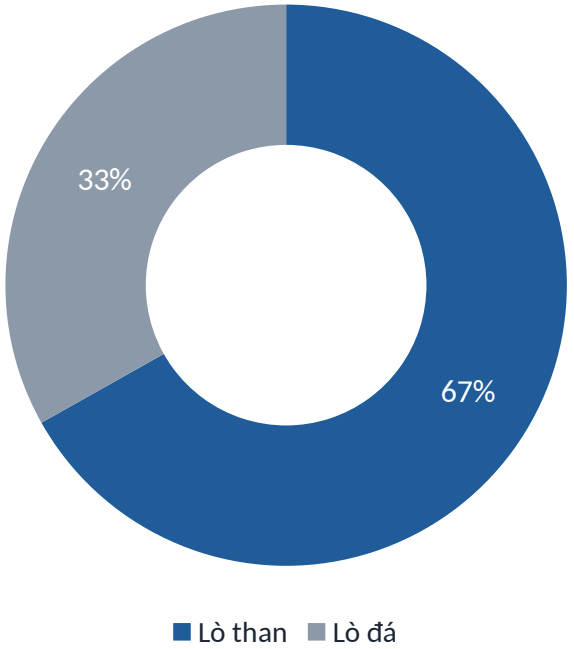

Theo vật liệu chống

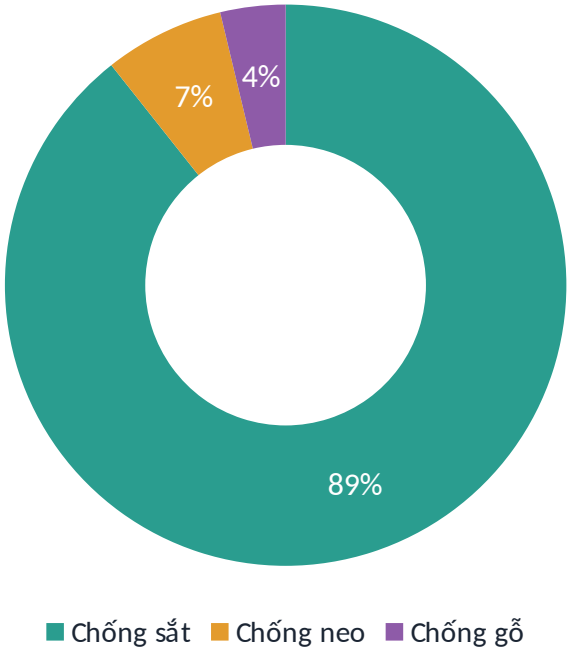

Chỉ tiêu	Mét	%
Lò than	16.979	66,8
Lò đá	8.421	33,2
Chống sắt	22.692	89,3
Chống neo	1.756	6,9
Chống gỗ	952	3,7
Đào CGH combai	1.500	5,9
Đào bán CGH	1.600	6,3

Tiết diện bình quân: lò đá 16,96 m², lò than 13,21 m².

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TONG_HOP.

Mét lò đào theo tháng: giảm mạnh trong quý IV




Quý	Mét	% năm
Quý I	6.460	25,4
Quý II	7.250	28,5
Quý III	6.693	26,4
Quý IV	4.997	19,7
Cả năm	**25.400**	**100,0**

Quý IV chỉ 4.997 m (19,7% năm), thấp nhất trong năm: cần chủ động chuẩn bị diện cho năm 2028.

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_ĐL.

Mét lò đào theo đơn vị: 6 PX đào lò đảm nhận 54,8%

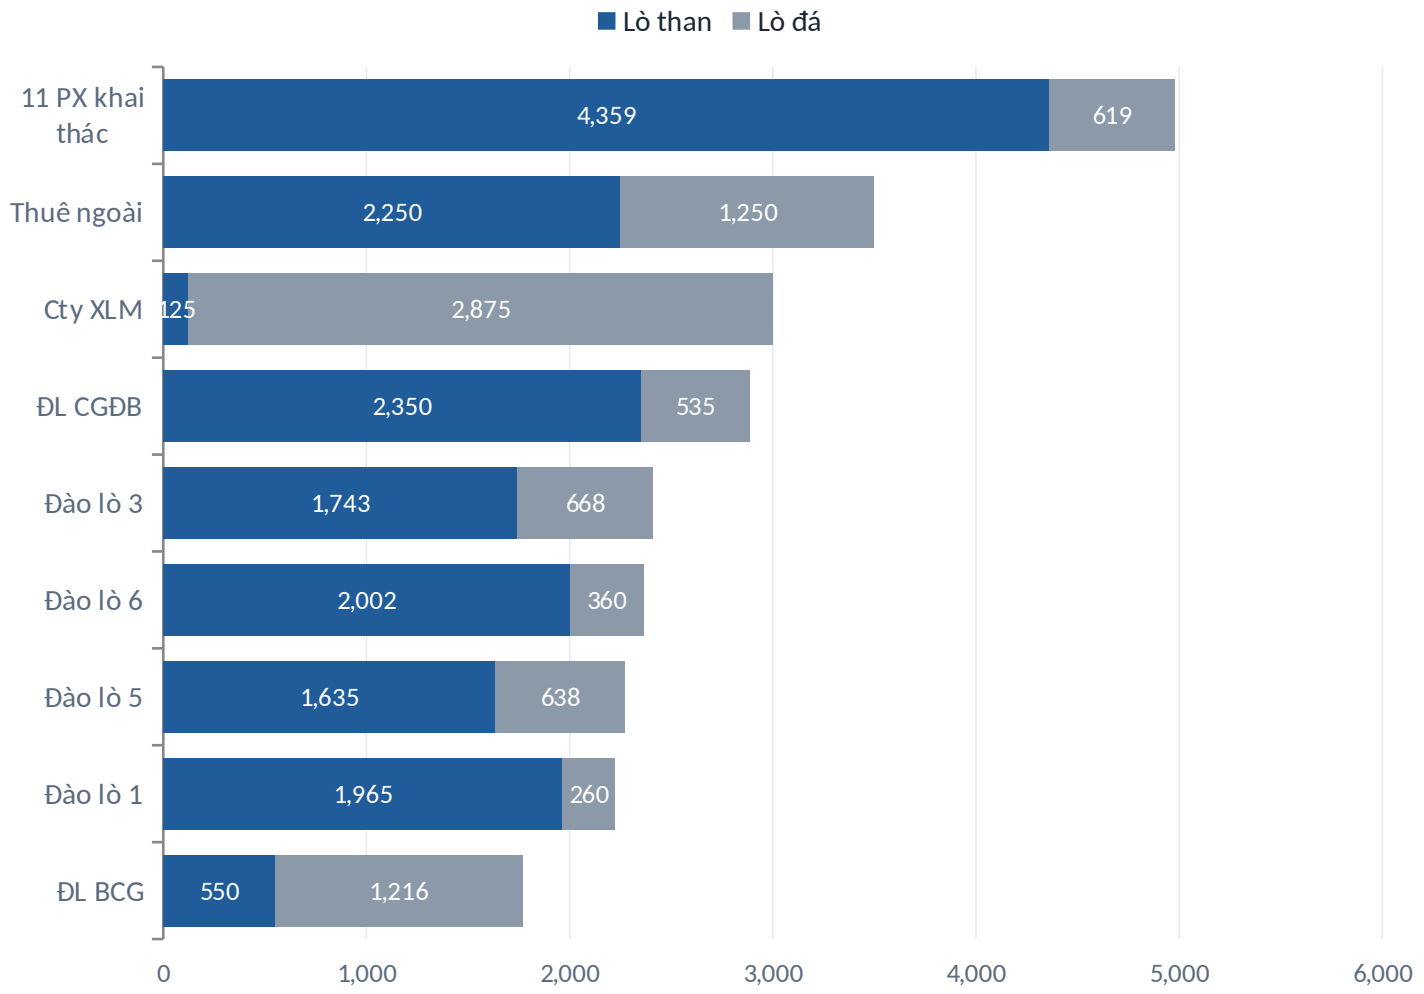

6 phân xưởng đào lò

13.922 m

54,8% tổng mét lò đào

Cty XLM + thuê ngoài TKV

6.500 m

25,6% · XLM 3.000 m, TN 3.500 m

11 PX khai thác tự đào

4.978 m

19,6% tổng mét lò đào

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TH_PX2027 và TH_G.KHOAN.

Chỉ tiêu đào, xén lò theo phân xưởng đào lò và đơn vị ngoài

Đơn vị	Mét đào (m)	Lò đá (m)	Lò than (m)	Mét xén (m)	Than đào, xén (tấn)	BQ tháng KH 2027 (m)	BQ tháng TH 9T/2026 (m)	Tăng (%)
ĐL CGĐB	2.885	535	2.350	360	45.700	240,4	132,4	+81,6%
ĐL BCG	1.766	1.216	550	500	11.800	147,2	108,6	+35,6%
Đào lò 3	2.411	668	1.743	200	32.400	200,9	146,2	+37,4%
Đào lò 1	2.225	260	1.965	435	34.700	185,4	160,7	+15,4%
Đào lò 5	2.273	638	1.635	385	30.600	189,4	214,0	-11,5%
Đào lò 6	2.362	360	2.002	360	34.800	196,8	159,4	+23,5%
Cty XLM	3.000	2.875	125	133	2.500	250,0	-	-
Thuê ngoài	3.500	1.250	2.250	2.867	37.500	291,7	-	-
Cộng	**20.422**	**7.802**	**12.620**	**5.240**	**230.000**			

TH 9T/2026 của Cty XLM và thuê ngoài theo mã đơn vị khác (HL1, PTH, QN, VN) nên không so sánh trực tiếp.


Nguồn: KH 2027: sheet TH_PX2027, TH_G.KHOAN; TH 9T/2026: tổng hợp KLM chốt 13/10/2026.

12 đường lò đào trọng điểm năm 2027

TT	Đơn vị	Đường lò	Sđ (m²)	Chống	Đá (m)	Than (m)	Tổng (m)
1	ĐL5	Lò DVVT chợ N-7-7/V7-KN	16,1	Thép	178	567	**745**
2	Cty XLM	Lò đặt ray -250 khu N.I	24,8	Thép	670	0	**670**
3	ĐL CGĐB	Lò DVVT chợ TT-4-1 (EBH)	16,1	Thép	20	580	**600**
4	Thuê ngoài	Lò DVTG chợ N-8a-1	11,2	Thép	165	435	**600**
5	ĐL1	Lò DVVT chợ TT-9-5A/V9-KTT	13,1	Thép	65	505	**570**
6	Thuê ngoài	Lò DVVT chợ N-8a-1	13,1	Thép	165	380	**545**
7	Cty XLM	Lò XV mức -250 khu ĐB.II	24,8	Thép	540	0	**540**
8	Thuê ngoài	Lò DVVT chợ TT-7-4/V7-KTT	11,2	Thép	125	375	**500**
9	ĐL BCG	Lò Thượng TG mức -250/-100/V7-KTT.IV (Hạ)	16,1	Thép	75	390	**465**
10	ĐL5	Lò DVVT chợ N-6-13/V6-KN	16,1	Thép	120	345	**465**
11	ĐL6	Lò DVTG chợ TT-7-6/V7-KTT	16,1	Thép	120	311	**431**
12	KT1	Lò BX+ DVVT chợ N-8-4A	11,2	Thép	111	309	**420**
	Cộng 12 đường lò				**2.354**	**4.197**	**6.551**

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_ĐL. 12 đường lò chiếm 25,8% tổng mét lò đào.

Mét lò xén: 7.500 m, thuê ngoài đảm nhận 38,2%

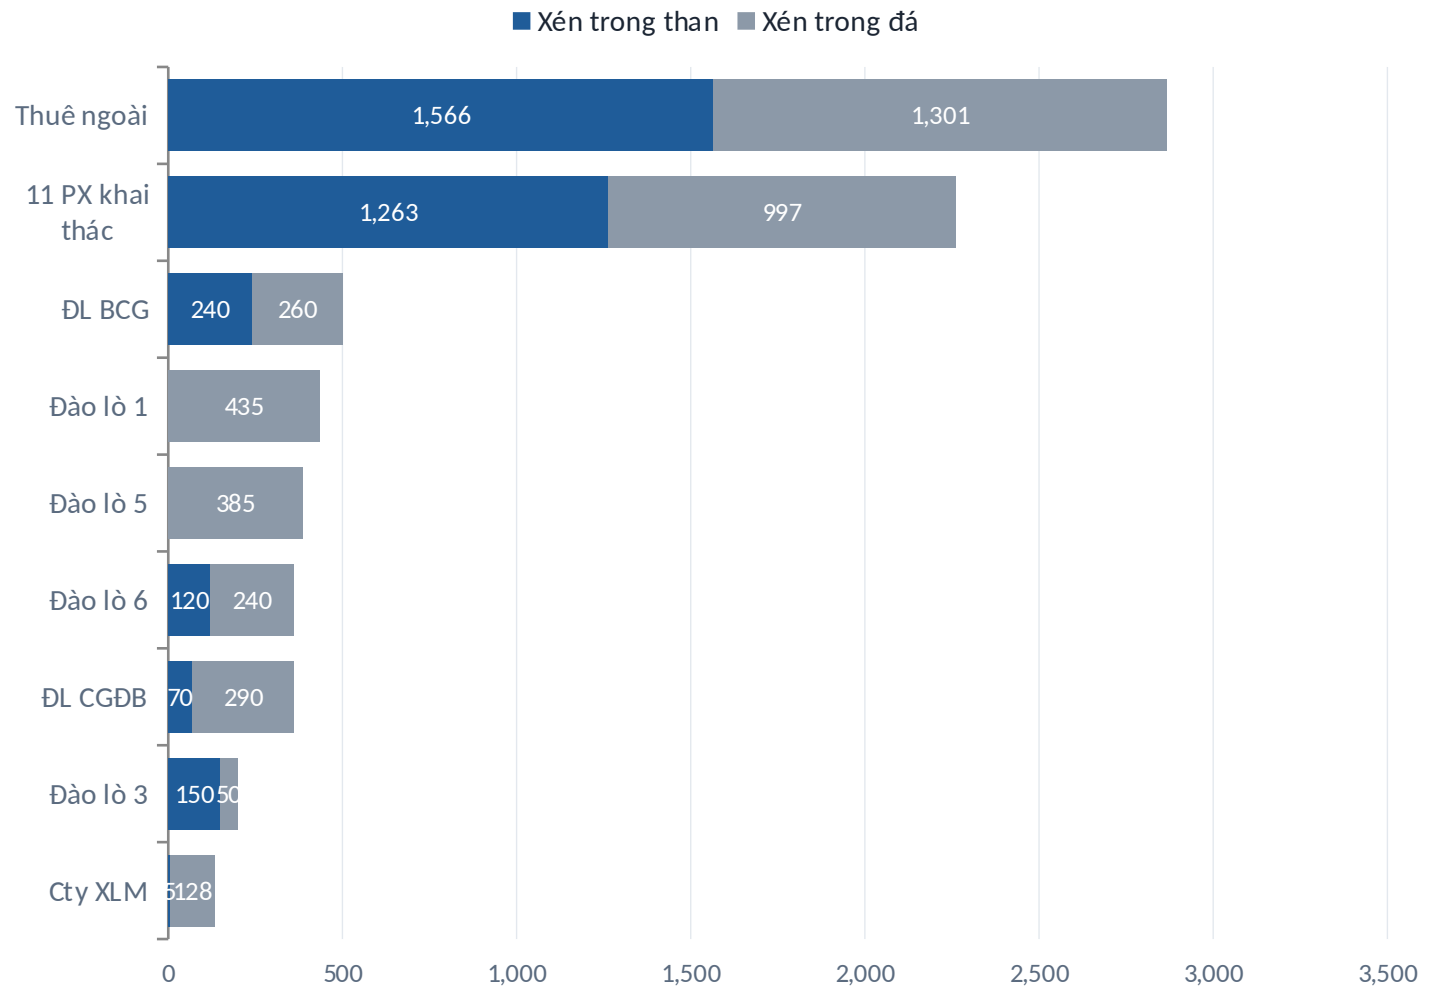

Thuê ngoài TKV

2.867 m

38,2% tổng mét lò xén

Tự làm

4.633 m

61,8% tổng mét lò xén

Xén trong đá / trong than

4.086 / 3.414 m

54,5% / 45,5%

Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TONG_HOP, TH_PX2027, TH_G.KHOAN.

5

Nhận diện thách thức

Những điểm cần tập trung điều hành từ số liệu kế hoạch

Những thách thức chính khi thực hiện kế hoạch 2027

1

Nhịp sản xuất

BQ tháng 2027 phải tăng +3,3% (than), +4,7% (mét đào), +9,2% (mét xén) so với BQ 9T/2026.

2

Lò chợ giàn ZRY

KH 12.925 tấn/tháng, cao hơn BQ 9T/2026 (9.143 tấn/tháng) +41,4%; 8 lò chợ ZRY phân tán ở PX KT3, KT5.

3

Đào lò cơ giới hóa

KH combai 1.500 m, chống neo 1.756 m; 9T/2026 chỉ đạt 459,9 m combai và 861,6 m chống neo.

4

Chuyển diện, chuẩn bị diện

37 lò chợ, nhiều diện kết thúc và chuyển diện trong năm; 12 lò chợ chuyển tiếp 2028 (818.600 tấn).

5

Đào lò quý IV


Quý IV chỉ 4.997 m (19,7% năm) trong khi phải chuẩn bị diện cho năm 2028.

6

Phụ thuộc thuê ngoài

Thuê ngoài TKV và Cty XLM đảm nhận 6.500 m đào (25,6%) và 2.867 m xén (38,2%).

Mức tăng sản lượng BQ tháng theo phân xưởng so với 9T/2026

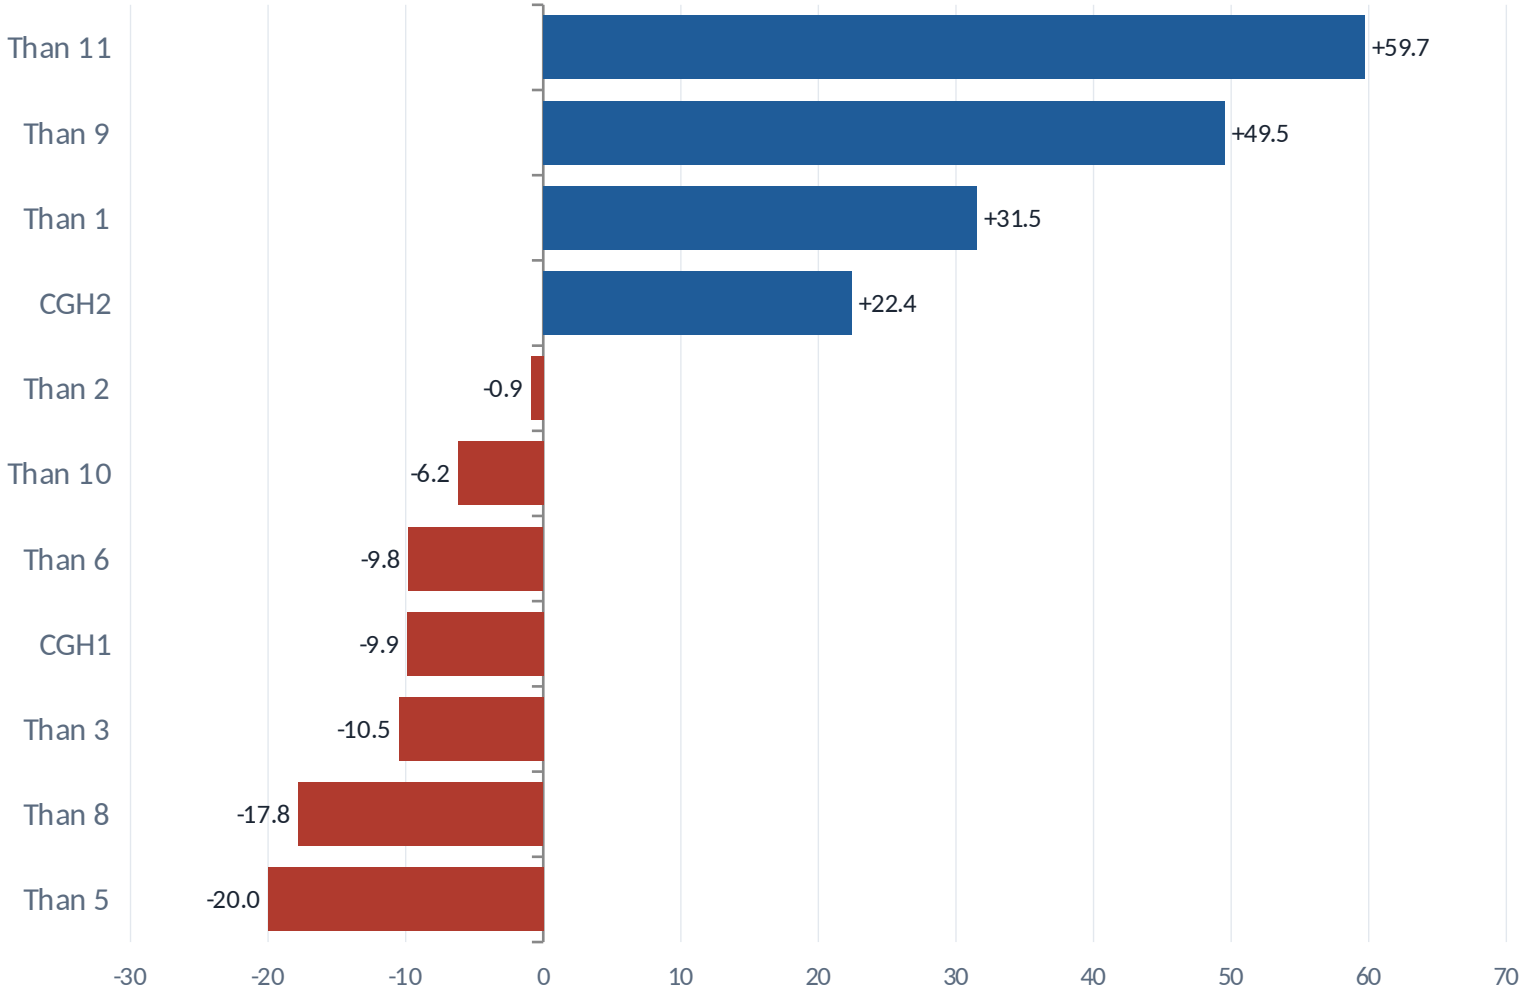

Cần ưu tiên kiểm soát

- **Than 11: +59,7%**
- **Than 9: +49,5%**
- **Than 1: +31,5%**

Các phân xưởng này cần được bảo đảm diện khai thác, thiết bị, lao động và kiểm tra tiến độ hàng tuần ngay từ quý I.

Nguồn: KH 2027: sheet TH_PX2027; TH 9T/2026: tổng hợp KLM chốt 13/10/2026.

6

Giải pháp và tổ chức thực hiện

Đề xuất của Phòng KCM

Giải pháp kỹ thuật - công nghệ

1 Khai thác lò chợ

- Duy trì 6 lò chợ CGH đạt 780.000 tấn; đưa lò chợ CGH dốc TT-11-10B vào khai thác đúng tháng 12/2027
- Hoàn thiện hộ chiếu, phương án kỹ thuật các lò chợ mới trước khi chuyển diện
- Kiểm soát độ tro: khai thác chọn lọc, hạn chế lẫn đá vách, trụ

2 Đào lò

- Tăng tỷ lệ chống neo (1.756 m), đào combai (1.500 m), bán CGH (1.600 m)
- Ưu tiên các đường lò chuẩn bị diện thay thế và diện năm 2028
- Bảo đảm tiến độ 12 đường lò trọng điểm

3 An toàn - kỹ thuật mỏ

- Thông gió, kiểm soát khí mỏ theo từng diện mới
- Thoát nước, phòng chống ngập mùa mưa bão
- Phòng ngừa than tự cháy tại các lò chợ kết thúc, tháo thu hồi thiết bị

Giải pháp tổ chức sản xuất và điều hành

1 Giao kế hoạch

- Giao kế hoạch quý, tháng chi tiết đến từng phân xưởng, từng lò chợ, đường lò
- Phân bổ đủ ngày công cho tháng 2 và các tháng cao điểm quý II

2 Chuyển diện

- Lập lịch chuyển diện cho 37 lò chợ, chuẩn bị thiết bị, vật tư trước tối thiểu 1 tháng
- Bố trí diện dự phòng (N-6a-1.1, 1.2, 1.3 PX KT5; diện CGH dự phòng)

3 Kiểm tra, đánh giá

- Giao ban tuần đánh giá sản lượng, mét lò theo từng phân xưởng
- Đánh giá tháng, điều chỉnh kịp thời khi có biến động điều kiện địa chất

Phân công tổ chức thực hiện

Đơn vị	Nhiệm vụ chính
Phòng KCM	Lập, giao kế hoạch tháng/quý; thiết kế, hộ chiếu kỹ thuật; theo dõi, tổng hợp khối lượng mỏ; thông gió, khí mỏ, thoát nước
Phòng Điều khiển sản xuất	Điều hành sản xuất hàng ngày; phối hợp vận tải, cung ứng giữa các phân xưởng
Phòng Cơ điện - Vận tải	Bảo đảm thiết bị CGH, combai, máy xúc, băng tải; lắp đặt, tháo chuyển thiết bị khi chuyển diện
Phòng Vật tư	Cung ứng vì chống, neo, giàn chống, vật tư nổ mìn đúng tiến độ
Phòng An toàn	Kiểm tra an toàn diện khai thác, đào lò; giám sát phòng chống mưa bão, ngập lò
11 PX khai thác	Thực hiện sản lượng giao; đào, xén lò trong phạm vi phân xưởng
6 PX đào lò, XLM, thuê ngoài	Bảo đảm tiến độ đường lò chuẩn bị diện, đặc biệt 12 đường lò trọng điểm

Tên và nhiệm vụ các phòng là đề xuất, đề nghị điều chỉnh theo quy chế phân công của Công ty.

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2027

2.500.000 tấn than · 25.400 m lò đào · 7.500 m lò xén

Xin trân trọng cảm ơn!
